

Mittelabflussplan (grob geschätzt) - muss jährlich an Planungs- und Bauablauf angepasst werden

Max-Planck-Schule - Neubauten

Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
BA 1	BA 1	BA 1	BA 1	BA 1/BA 2	BA 2	BA 2	BA 2	Gesamt
1.200.000,00 €	14.500.000,00 €	20.700.000,00 €	24.800.000,00 €	21.600.000,00 €	25.500.000,00 €	28.500.000,00 €	30.500.000,00 €	167.300.000,00 €

Bauabschnitt 1, BA 2a + b gemeinsam, 2c danach


2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
BA 1	BA 1	BA 1	BA 1	BA 1/BA 2a + b	BA 2a + b	BA 2a + b	BA 2a + b/BA 2c	BA 2c	BA 2c	Gesamt
1.200.000,00 €	13.900.000,00 €	19.900.000,00 €	23.700.000,00 €	15.700.000,00 €	22.500.000,00 €	23.200.000,00 €	19.500.000,00 €	12.300.000,00 €	14.200.000,00 €	166.100.000,00 €

Bauabschnitt 1, BA 2a, BA 2b, BA 2c

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
BA 1	BA 1	BA 1	BA 1	BA 1/BA 2a	BA 2a	BA 2a	BA 2a/BA 2b	BA 2b	BA 2b/BA 2c	BA 2c	BA 2c	Gesamt
1.200.000,00 €	13.500.000,00 €	19.500.000,00 €	23.500.000,00 €	13.900.000,00 €	15.400.000,00 €	16.200.000,00 €	17.900.000,00 €	11.800.000,00 €	13.200.000,00 €	12.000.000,00 €	10.900.000,00 €	169.000.000,00 €

Mögliche Unterteilung des Bauabschnitts 2 (Unterrichtsräume und Verwaltung)

Variante 1 BA 2 a+b+c gemeinsam (Ergebnis LP2)

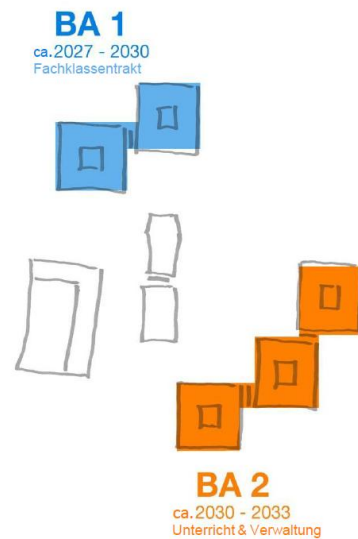


167,28 Mio. Euro
Kostenrahmen (je nach Umsetzungsmodell)

Variante 2 BA 2 a+b gemeinsam, c danach



166,07 Mio. Euro

Variante 3 BA 2 getrennt in a,b,c

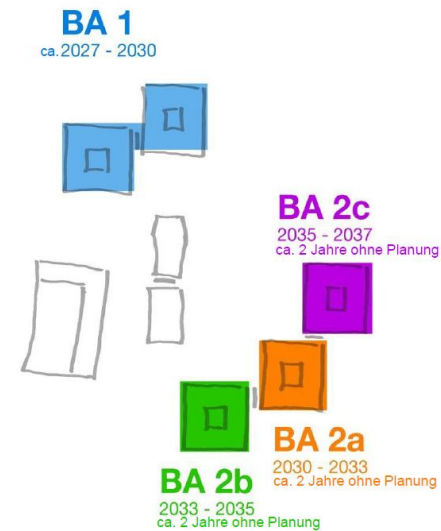

169,02 Mio. Euro
