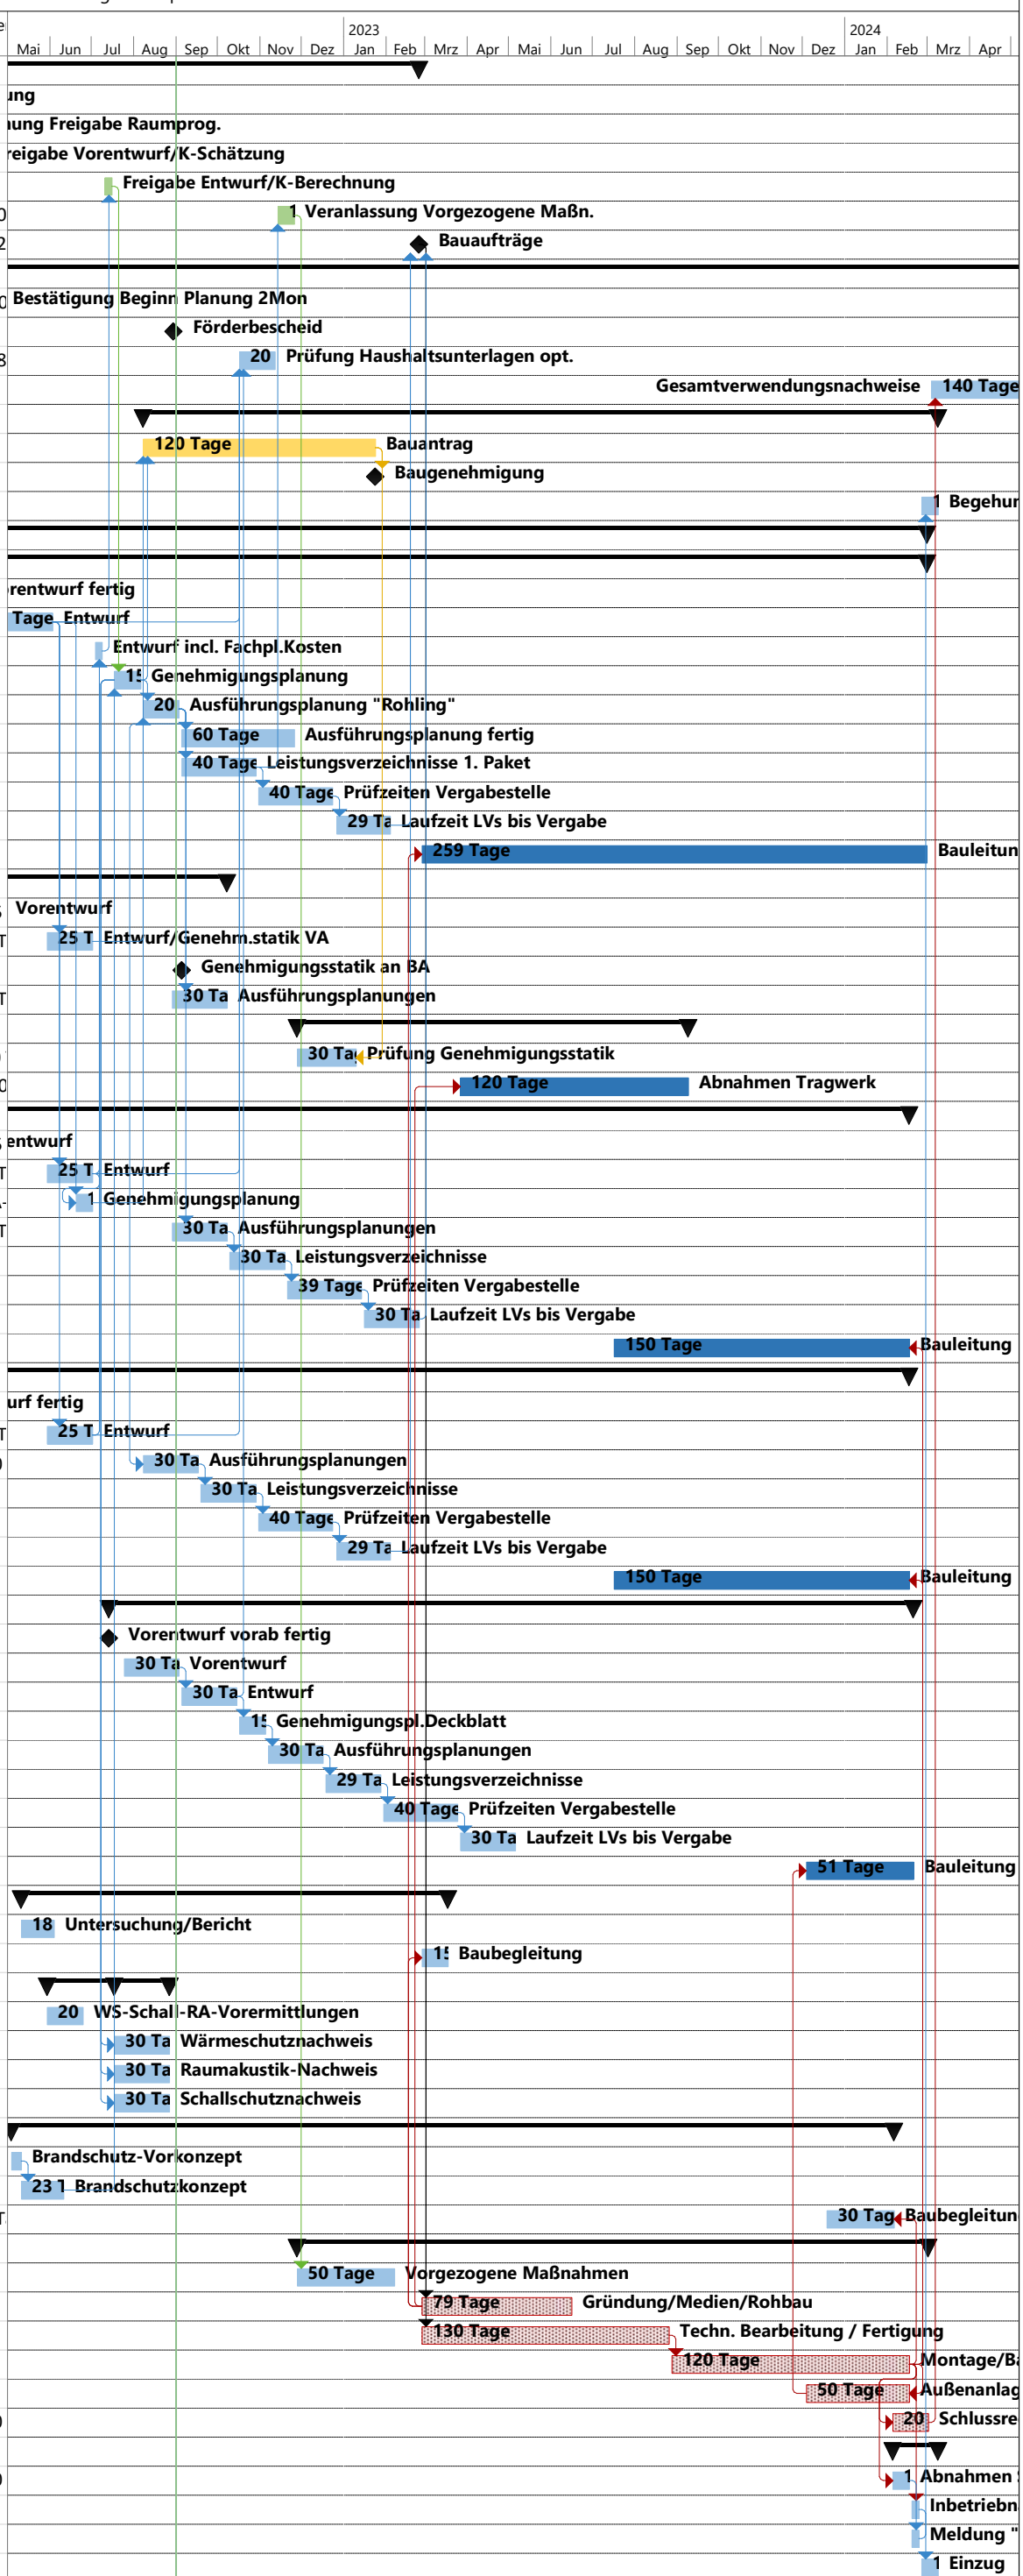Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänge
1	**Gemeinde**	**314 Tage**	**Mon 06.12.21**	**Fre 24.02.23**	
2	Beauftragungen Planung	5 Tage	Mon 06.12.21	Fre 10.12.21	
3	Abstimmung Freigabe Raumprog.	0 Tage	Mit 23.02.22	Mit 23.02.22	
4	Freigabe Vorentwurf/K-Schätzung	0 Tage	Don 07.04.22	Don 07.04.22	19
5	Freigabe Entwurf/K-Berechnung	5 Tage	Mon 11.07.22	Fre 15.07.22	21
6	Veranlassung Vorgezogene Maßn.	10 Tage	Mon 14.11.22	Fre 25.11.22	25EA+10
7	Bauaufträge	0 Tage	Fre 24.02.23	Fre 24.02.23	27;44;52
8	**Förderungsgeber**	**622 Tage**	**Mit 20.04.22**	**Fre 13.09.24**	
9	Bestätigung Beginn Planung 2Mon	5 Tage	Mit 20.04.22	Die 26.04.22	19AA+40
10	Förderbescheid	0 Tage	Die 30.08.22	Die 30.08.22	
11	Prüfung Haushaltsunterlagen opt.	20 Tage	Mon 17.10.22	Fre 11.11.22	20;39;48
12	Gesamtverwendungsnachweise	140 Tage	Mon 04.03.24	Fre 13.09.24	82
13	**Bauamt**	**409 Tage**	**Mon 08.08.22**	**Fre 08.03.24**	
14	Bauantrag	120 Tage	Mon 08.08.22	Mon 23.01.2	22;40
15	Baugenehmigung	0 Tage	Mon 23.01.23	Mon 23.01.2	14
16	Begehung zur Fertigstellung	10 Tage	Mon 26.02.24	Fre 08.03.24	86
17	**Planer Arch/HLS/E/Statik/LaP**	**521 Tage**	**Mit 23.02.22**	**Don 29.02.24**	
18	**Architektur**	**521 Tage**	**Mit 23.02.22**	**Don 29.02.24**	
19	Vorentwurf fertig	32 Tage	Mit 23.02.22	Don 07.04.22	3
20	Entwurf	40 Tage	Fre 08.04.22	Don 02.06.22	4
21	Entwurf incl. Fachpl.Kosten	5 Tage	Mon 04.07.22	Fre 08.07.22	39;48
22	Genehmigungsplanung	15 Tage	Mon 18.07.22	Fre 05.08.22	74;5
23	Ausführungsplanung "Rohling"	20 Tage	Mon 08.08.22	Fre 02.09.22	22;31
24	Ausführungsplanung fertig	60 Tage	Mon 05.09.22	Fre 25.11.22	23
25	Leistungsverzeichnisse 1. Paket	40 Tage	Mon 05.09.22	Fre 28.10.22	23
26	Prüfzeiten Vergabestelle	40 Tage	Mon 31.10.22	Fre 23.12.22	25
27	Laufzeit LVs bis Vergabe	29 Tage	Die 27.12.22	Fre 03.02.23	26
28	Bauleitung	259 Tage	Mon 27.02.23	Don 29.02.24	78AA
29	**Tragwerk/Statik**	**146 Tage**	**Fre 18.03.22**	**Fre 07.10.22**	
30	Vorentwurf	30 Tage	Fre 18.03.22	Don 28.04.22	19EA-15
31	Entwurf/Genehm.statik VA	25 Tage	Mon 30.05.22	Fre 01.07.22	20EA-4 T
32	Genehmigungsstatik an BA	0 Tage	Mon 05.09.22	Mon 05.09.2	
33	Ausführungsplanungen	30 Tage	Mon 29.08.22	Fre 07.10.22	23EA-5 T
34	**Prüfung Statik**	**204 Tage**	**Mon 28.11.22**	**Fre 08.09.23**	
35	Prüfung Genehmigungsstatik	30 Tage	Mon 28.11.22	Mon 09.01.2	14EE-10
36	Abnahmen Tragwerk	120 Tage	Mon 27.03.23	Fre 08.09.23	78AA+20
37	**HLS**	**495 Tage**	**Fre 18.03.22**	**Fre 16.02.24**	
38	Vorentwurf	9 Tage	Fre 18.03.22	Mit 30.03.22	19EA-15
39	Entwurf	25 Tage	Mon 30.05.22	Fre 01.07.22	20EA-4 T
40	Genehmigungsplanung	10 Tage	Mon 20.06.22	Fre 01.07.22	20;39EA-
41	Ausführungsplanungen	30 Tage	Mon 29.08.22	Fre 07.10.22	23EA-5 T
42	Leistungsverzeichnisse	30 Tage	Mon 10.10.22	Fre 18.11.22	41
43	Prüfzeiten Vergabestelle	39 Tage	Mon 21.11.22	Fre 13.01.23	42
44	Laufzeit LVs bis Vergabe	30 Tage	Mon 16.01.23	Fre 24.02.23	43
45	Bauleitung	150 Tage	Mon 17.07.23	Fre 16.02.24	80EE
46	**Elektro**	**512 Tage**	**Mit 23.02.22**	**Fre 16.02.24**	
47	Vorentwurf fertig	0 Tage	Mit 23.02.22	Mit 23.02.22	
48	Entwurf	25 Tage	Mon 30.05.22	Fre 01.07.22	20EA-4 T
49	Ausführungsplanungen	30 Tage	Mon 08.08.22	Fre 16.09.22	23EA-20
50	Leistungsverzeichnisse	30 Tage	Mon 19.09.22	Fre 28.10.22	49
51	Prüfzeiten Vergabestelle	40 Tage	Mon 31.10.22	Fre 23.12.22	50
52	Laufzeit LVs bis Vergabe	29 Tage	Die 27.12.22	Fre 03.02.23	51
53	Bauleitung	150 Tage	Mon 17.07.23	Fre 16.02.24	80EE
54	**Landschaft**	**412 Tage**	**Don 14.07.22**	**Mon 19.02.2**	
55	Vorentwurf vorab fertig	0 Tage	Don 14.07.22	Don 14.07.22	
56	Vorentwurf	30 Tage	Mon 25.07.22	Fre 02.09.22	
57	Entwurf	30 Tage	Mon 05.09.22	Fre 14.10.22	56
58	Genehmigungspl.Deckblatt	15 Tage	Mon 17.10.22	Fre 04.11.22	57
59	Ausführungsplanungen	30 Tage	Mon 07.11.22	Fre 16.12.22	58
60	Leistungsverzeichnisse	29 Tage	Mon 19.12.22	Fre 27.01.23	59
61	Prüfzeiten Vergabestelle	40 Tage	Mon 30.01.23	Fre 24.03.23	60
62	Laufzeit LVs bis Vergabe	30 Tage	Mon 27.03.23	Fre 05.05.23	61
63	Bauleitung	51 Tage	Mon 04.12.23	Mon 19.02.2	81AA
64	**Bodengutachter**	**222 Tage**	**Mit 11.05.22**	**Fre 17.03.23**	
65	Untersuchung/Bericht	18 Tage	Mit 11.05.22	Fre 03.06.22	
66	Baubegleitung	15 Tage	Mon 27.02.23	Fre 17.03.23	78AA
67	**Bauphysik**	**65 Tage**	**Mon 30.05.22**	**Fre 26.08.22**	
68	WS-Schall-RA-Vorermittlungen	20 Tage	Mon 30.05.22	Fre 24.06.22	
69	Wärmeschutznachweis	30 Tage	Mon 18.07.22	Fre 26.08.22	22AA
70	Raumakustik-Nachweis	30 Tage	Mon 18.07.22	Fre 26.08.22	22AA
71	Schallschutznachweis	30 Tage	Mon 18.07.22	Fre 26.08.22	22AA
72	**Brandschutz**	**453 Tage**	**Mit 04.05.22**	**Mon 05.02.2**	
73	Brandschutz-Vorkonzept	5 Tage	Mit 04.05.22	Die 10.05.22	
74	Brandschutzkonzept	23 Tage	Mit 11.05.22	Fre 10.06.22	73
75	Baubegleitung	30 Tage	Die 19.12.23	Mon 05.02.2	80EE-9 T
76	**Bau**	**324 Tage**	**Mon 28.11.22**	**Fre 01.03.24**	
77	Vorgezogene Maßnahmen	50 Tage	Mon 28.11.22	Mon 06.02.2	6
78	Gründung/Medien/Rohbau	79 Tage	Mon 27.02.23	Don 15.06.23	7
79	Techn. Bearbeitung / Fertigung	130 Tage	Mon 27.02.23	Fre 25.08.23	7
80	Montage/Bau	120 Tage	Mon 28.08.23	Fre 16.02.24	79
81	Außenanlagen	50 Tage	Mon 04.12.23	Fre 16.02.24	80EE
82	Schlussrechnungen	20 Tage	Mon 05.02.24	Fre 01.03.24	80EA-10
83	**Fertigstellung**	**25 Tage**	**Mon 05.02.24**	**Fre 08.03.24**	
84	Abnahmen Sachverständige	10 Tage	Mon 05.02.24	Fre 16.02.24	80EA-10
85	Inbetriebnahmen	5 Tage	Mon 19.02.24	Fre 23.02.24	80
86	Meldung "Fertigstellung"	5 Tage	Mon 19.02.24	Fre 23.02.24	84
87	Einzug	10 Tage	Mon 26.02.24	Fre 08.03.24	85
