&[project_start_date]
&[project_finish_date]

BAUABLAUFPLAN
Freibad Erleborn

21.10.2024

Stichtag: 10.07.23 00:00

Nr.	Name	Dauer AT	Anfang	Ende	Abgeschlossen %
1	Auftragerteilung an Architekt	0	24.07.23 08:00	24.07.23 08:00	100
2	Auftragerteilung an Architekt	0	24.07.23 08:00	24.07.23 08:00	100
3	LPH 5 - Ausführungsplanung Freianlagen	94	09.02.24 08:00	19.06.24 17:00	0
4	LPH 1 - Grundlagenermittlung	10	24.07.23 08:00	04.08.23 17:00	100
5	LPH 1 - Grundlagenermittlung	10	24.07.23 08:00	04.08.23 17:00	90
6	Zuarbeit von PGVA zum LV-Abbruch	53	27.09.23 08:00	08.12.23 17:00	100
7	LPH 2 - Vorentwurfsplanung	9	25.07.23 08:00	04.08.23 17:00	100
8	LPH 2 - Vorentwurfsplanung	9	25.07.23 08:00	04.08.23 17:00	100
9	1. Öffentlichkeitsbeteiligung	0	22.08.23 08:00	22.08.23 08:00	100
10	Abstimmung mit AG	0	08.08.23 08:00	08.08.23 08:00	100
11	Abstimmung mit AG	0	08.08.23 08:00	08.08.23 08:00	100
12	Ergänzungen LPH 2	9	09.08.23 08:00	21.08.23 17:00	100
13	Ergänzungen LPH 2	9	09.08.23 08:00	21.08.23 17:00	100
14	1. Öffentlichkeitsbeteiligung	0	22.08.23 08:00	22.08.23 08:00	100
15	ggf. Änderungen + Kostenschätzung	10	22.08.23 08:00	04.09.23 17:00	100
16	ggf. Änderungen + Kostenschätzung	10	22.08.23 08:00	04.09.23 17:00	100
17	2. Öffentlichkeitsbeteiligung/ Bauausschuss	0	05.09.23 08:00	05.09.23 08:00	100
18	Freigabe zur Erstellung LPH 3	0	06.09.23 08:00	06.09.23 08:00	100
19	Ratssitzung mit Beschluss zur Ducrhführung	0	05.02.24 08:00	05.02.24 08:00	100
20	Einbinden der Fachplaner TGA, Tragwerk	20	06.09.23 08:00	03.10.23 17:00	100
21	**Vergabeverfahren Lüftung**	**198**	**26.01.24 08:00**	**29.10.24 17:00**	**0**
21.1	LPH 5 - Ausfürgungsplanung Lüftung	94	20.06.24 08:00	29.10.24 17:00	0
21.2	Übergabe LV Lüftung an AG	0	26.01.24 08:00	26.01.24 08:00	0
21.3	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	26.01.24 08:00	08.02.24 17:00	0
21.4	Veröffentlichung	0	08.02.24 17:00	08.02.24 17:00	0
21.5	Angebotsfrist	20	09.02.24 08:00	07.03.24 17:00	0
21.6	Submission	0	07.03.24 17:00	07.03.24 17:00	0
21.7	Auswertung + Vergabevorschlag	15	08.03.24 08:00	28.03.24 17:00	0
21.8	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	29.03.24 08:00	11.04.24 17:00	0
22	**Vergabeverfahren Sanitär**	**179**	**07.08.23 08:00**	**11.04.24 17:00**	**33**
22.1	LPH 5 - Ausfürgungsplanung Sanitär	94	07.08.23 08:00	14.12.23 17:00	50
22.2	Übergabe LV Sanitär an AG	0	26.01.24 08:00	26.01.24 08:00	100
22.3	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	26.01.24 08:00	08.02.24 17:00	50
22.4	Veröffentlichung	0	08.02.24 17:00	08.02.24 17:00	0
22.5	Angebotsfrist	20	09.02.24 08:00	07.03.24 17:00	0
22.6	Submission	0	07.03.24 17:00	07.03.24 17:00	0
22.7	Auswertung + Vergabevorschlag	15	08.03.24 08:00	28.03.24 17:00	0
22.8	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	29.03.24 08:00	11.04.24 17:00	0
23	**Vergabeverfahren ELT-Beleuchtung-Blitzschutz**	**171**	**26.01.24 08:00**	**20.09.24 17:00**	**83**
23.1	LPH 5 - Ausfürgungsplanung ELT, Beleuchtung, Bl...	94	14.05.24 08:00	20.09.24 17:00	0
23.2	Übergabe LV ELT - Beleuchtung - Blitzschutz an AG	0	26.01.24 08:00	26.01.24 08:00	100
23.3	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	26.01.24 08:00	08.02.24 17:00	100
23.4	Veröffentlichung	0	08.02.24 17:00	08.02.24 17:00	100
23.5	Angebotsfrist	20	09.02.24 08:00	07.03.24 17:00	100
23.6	Submission	0	07.03.24 17:00	07.03.24 17:00	100
23.7	Auswertung + Vergabevorschlag	15	08.03.24 08:00	28.03.24 17:00	100
23.8	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	29.03.24 08:00	11.04.24 17:00	100
24	**LPH 5 - Ausfügrungsplanung Außenanlagen**	**50**	**07.06.24 08:00**	**15.08.24 17:00**	**50**
24.1	LPH 5 - Ausfügrungsplanung Außenanlagen	50	07.06.24 08:00	15.08.24 17:00	50
25	Bauanlaufgespräch Fachplaner	0	12.02.24 08:00	12.02.24 08:00	100
26	Bauanlaufgespräch Fachplaner	0	12.02.24 08:00	12.02.24 08:00	100
27	Auftragsvergaben	0	18.04.24 17:00	18.04.24 17:00	100
28	Einweisungen	0	18.04.24 17:00	18.04.24 17:00	100
29	Schadstoffkataster	14	19.04.24 08:00	08.05.24 17:00	100
30	Materialbeschaffung	61	11.01.24 08:00	04.04.24 17:00	0
31	Voruntersuchung Tragwerk Dach Umkleide	15	12.02.24 08:00	01.03.24 17:00	100
32	Voruntersuchung Tragwerk Dach Umkleide	15	12.02.24 08:00	01.03.24 17:00	100
33	Abstimmen Größe Chlorgasraum + Zugang Tecnik	15	12.02.24 08:00	01.03.24 17:00	100
34	Abstimmen Größe Chlorgasraum + Zugang Tecnik	15	12.02.24 08:00	01.03.24 17:00	100
35	**Baustelleneinrichtung**	**287**	**09.05.24 08:00**	**13.06.25 17:00**	**50**
35.1	Bauzaun / WC / Lagerplätze / Baumschutz	10	09.05.24 08:00	22.05.24 17:00	100
35.2	Baustraße	10	23.05.24 08:00	05.06.24 17:00	100
35.3	Wasser aus Becken ablassen (Auftriebssicherung)	5	10.06.24 08:00	14.06.24 17:00	0
35.4	Rückbau Baustelleneinrichtung	15	26.05.25 08:00	13.06.25 17:00	0
36	**Abbrucharbeiten**	**104.88**	**06.06.24 08:00**	**30.10.24 16:00**	**75**
36.1	Entrümpeln + Entsorgung Schadstoffe	10	06.06.24 08:00	19.06.24 17:00	100
36.2	Abbruch+Entsorgung Kinderbecken	9	20.06.24 08:00	02.07.24 17:00	100
36.3	Abbruch+Entsorgung Umkleidegebäude	13	20.06.24 08:00	08.07.24 17:00	100
36.4	Abbrucharbeiten Beckenumgänge	9	20.06.24 08:00	02.07.24 17:00	100
36.5	Abbrucharbeiten Schwimmmeistergebäude	5	18.07.24 08:00	24.07.24 17:00	100
36.6	Abbruch + Entsorgung Schwimmbadfolie	9	17.06.24 08:00	27.06.24 17:00	100
36.7	Abbrucharbeiten Betonschnitt Beckenkopf	10	24.06.24 08:00	05.07.24 17:00	100
36.8	Betonschneidearbeiten + Entsorgung	20	28.06.24 08:00	25.07.24 17:00	100
36.9	Abbruch Beckenwände	10	31.07.24 08:00	13.08.24 17:00	100
36.10	Abbrucharbeiten Heizungsraum Rest	1	28.10.24 08:00	28.10.24 17:00	0
36.11	Abbrucharbeiten Technukraum Rest	3	24.10.24 08:00	28.10.24 17:00	0
36.12	Betonschneidearbeiten Beckenboden	7	21.10.24 16:00	30.10.24 16:00	0
37	**Leistungsphase 5**	**105**	**10.06.24 08:00**	**01.11.24 17:00**	**73**
37.1	Ausführungsplanung Freianlagen, Gebäude Lph 5	35	10.06.24 08:00	01.11.24 17:00	65
37.3	Ausführungsplanung TGA BWT Lph 5	30	20.06.24 08:00	25.10.24 17:00	75
37.5	Ausführungsplanung Tragwerk	15	08.10.24 08:00	28.10.24 17:00	80
38	**Gerüstbauarbeiten**	**128**	**19.06.24 08:00**	**13.12.24 17:00**	**50**
38.1	Gerüstbau MZB	5	19.06.24 08:00	25.06.24 17:00	100
38.2	Gerüstbau Umkleidegebäude	5	09.12.24 08:00	13.12.24 17:00	0
38.3	Gerüstbau Schwimmmeistergebäude	5	16.10.24 13:00	23.10.24 12:00	50
39	**Leistungsphase 6 + 7**	**171**	**08.07.24 08:00**	**03.03.25 17:00**	**67**
39.1	Vorbereiten der Vergabe Teil 1 + 2 Bau Lph 6	10	08.07.24 08:00	19.07.24 17:00	100
39.2	Vorbereiten der Vergabe Teil 3 Lph 6	30	21.10.24 08:00	29.11.24 17:00	0
39.3	Vorbereiten der Vergabe TGA - Lph 6	18.5	11.07.24 08:00	06.08.24 12:00	100
39.4	Angebotsfristen Teil 1 - Gerüst, Abbruch, Rohbau, ...	15	22.07.24 08:00	09.08.24 17:00	100
39.5	Submission Teil 1	0	09.08.24 17:00	09.08.24 17:00	100
39.6	Mitwirken bei der Vergabe Bau + TGA Lph 7 Teil 1	10	12.08.24 08:00	23.08.24 17:00	100
39.7	VA-Sitzung zur Auftragsvergabe	0	12.08.24 08:00	12.08.24 08:00	100
39.8	Auftragsvergaben Badeplatte Teil 1, Abbruch	0	23.08.24 17:00	23.08.24 17:00	100
39.9	Nachprüfungen RPA Teil 1	8	19.09.24 08:00	30.09.24 17:00	100
39.10	Angebotsfristen Teil 2 - BWT, TGA	15	06.08.24 13:00	27.08.24 12:00	100
39.11	Submission Teil 2	0	27.08.24 12:00	27.08.24 12:00	100
39.12	Mitwirken bei der Vergabe Teil 2	10	27.08.24 13:00	10.09.24 12:00	100
39.13	Auftragsvergabe Teil 2	0	10.09.24 13:00	10.09.24 13:00	100
39.14	Nachprüfungen RPA Teil 2	10	11.09.24 13:00	25.09.24 12:00	100
39.15	Angebotsfristen Teil 3 - kleine Gewerke (Zimmerer,...	15	20.01.25 08:00	07.02.25 17:00	0
39.16	Submission Teil 3	0	10.02.25 08:00	10.02.25 08:00	0
39.17	Mitwirken bei der Vergabe Teil 3	10	11.02.25 08:00	24.02.25 17:00	0
39.18	Auftragsvergabe Teil 3	0	24.02.25 17:00	24.02.25 17:00	0
39.19	Nachprüfungen RPA Teil 3	5	25.02.25 08:00	03.03.25 17:00	0
40	**Edelstahlarbeiten**	**231.5**	**13.06.24 12:00**	**02.05.25 17:00**	**56**
40.1	Maßkontrollen MZB+KIB	0	07.11.24 16:00	07.11.24 16:00	0
40.2	Übergabe Ausführungsplanung an AN	0	13.06.24 12:00	13.06.24 12:00	100
40.3	Werkplanung MZB+KIB	23	24.06.24 13:00	25.07.24 12:00	100
40.4	Freigabe der Schnitthöhen Beckenkopf MZB	0	08.07.24 08:00	08.07.24 08:00	100
40.5	Prüfung Werkplanung MZB+KIB	15	25.07.24 13:00	15.08.24 12:00	100
40.6	Ergänzungen und Freigabe Werkplanung	15	02.09.24 08:00	20.09.24 17:00	100
40.7	Werkseitige Herstellung MZB+KIB	30	23.09.24 08:00	01.11.24 17:00	100
40.8	Montage Oberwände MZB	10	04.11.24 08:00	15.11.24 17:00	100
40.9	Montage Unterwände MZB + Wasserführung	15	18.11.24 08:00	06.12.24 17:00	100
40.10	Montage Rinnen + Bodenkanäle	15	09.12.24 08:00	27.12.24 17:00	100
40.11	Montage Beckenboden MZB	20	12.02.25 13:00	12.03.25 12:00	0
40.12	Montage Edelstahlbecken Kinderbecken	30	24.03.25 08:00	02.05.25 17:00	0
40.13	Beizreinigung	3	12.03.25 13:00	17.03.25 12:00	0
40.14	Reinigung	3	17.03.25 13:00	20.03.25 12:00	0
40.15	Befüllung der Becken	10	04.04.25 08:00	17.04.25 17:00	0
40.16	**Pufferzeiten + Betriebsfreie Zeiten**	**146**	**26.08.24 08:00**	**17.03.25 17:00**	**38**
40.16.1	Schlechtwetterausfälle	44	25.11.24 08:00	17.03.25 17:00	15
40.16.4	Betriebsferien Firmen	20	26.08.24 08:00	20.09.24 17:00	100
40.16.5	Weihnachtspause	19	17.12.24 08:00	10.01.25 17:00	0
41	**Rohbauarbeiten Umkleidegebäude+KIB-/Technik**	**178**	**03.07.24 08:00**	**07.03.25 17:00**	**24**
41.1	Baugrube für Technikgebäude herstellen	10	03.07.24 08:00	16.07.24 17:00	95
41.2	Wasserhaltung Technikgebäude	15	17.07.24 08:00	06.08.24 17:00	0
41.3	Stahlbetonarbeiten Keller Technik Kinderbecken	35	23.09.24 08:00	08.11.24 17:00	100
41.4	Stahlbeton Sohle Kinderbecken	10	27.01.25 08:00	07.02.25 17:00	0
41.5	Stahlbetonarbeiten Decke ü. KG Technik KIB+Sch...	20	11.11.24 08:00	06.12.24 17:00	0
41.6	Fundamente Schwimmbadtechnische Ausrüstung	15	17.02.25 08:00	07.03.25 17:00	0
41.7	Mauerarbeiten EG	30	09.12.24 08:00	17.01.25 17:00	0
41.8	Ringbalken	10	20.01.25 08:00	31.01.25 17:00	0
42	**Fenster + Türen**	**20.5**	**10.02.25 08:00**	**10.03.25 12:00**	**0**
42.1	Montage Fenster + Außentüren	5	10.02.25 08:00	14.02.25 17:00	0
42.2	Montage Innentüren	10	24.02.25 13:00	10.03.25 12:00	0
43	**Schwimmbadt. Ausstattung**	**53**	**27.12.24 17:00**	**12.03.25 17:00**	**0**
43.1	Ausführungsplanung Schwimmbdt.	0	27.12.24 17:00	27.12.24 17:00	30
43.2	Werkplanung Sprunganlagen	11	09.01.25 13:00	24.01.25 12:00	0
43.3	Angabe Fundamente Sprunganlagen	0	29.01.25 08:00	29.01.25 08:00	0
43.4	Werkseitige Herstellung	20	30.01.25 08:00	26.02.25 17:00	0
43.5	Montage Sprunganlagen	10	27.02.25 08:00	12.03.25 17:00	0
43.6	Montage Duschen	10	27.02.25 08:00	12.03.25 17:00	0
44	**Zimmer- und Dachdeckerarbeiten**	**48**	**03.02.25 08:00**	**09.04.25 17:00**	**0**
44.1	Abbund Pultdach	10	03.02.25 08:00	14.02.25 17:00	0
44.2	Dachschalung+Dampfsperre	10	17.02.25 08:00	28.02.25 17:00	0
44.3	Dämmung Dach	10	03.03.25 08:00	14.03.25 17:00	0
44.4	Folienabdichtung (geklebt)	10	17.03.25 08:00	28.03.25 17:00	0
44.5	Dachrand+Entwässerung	8	31.03.25 08:00	09.04.25 17:00	0
45	**Badewassertechnik**	**205**	**24.06.24 08:00**	**04.04.25 17:00**	**20**
45.1	Abbruch alte Filter, Maschinen etc.	17	24.06.24 08:00	16.07.24 17:00	100
45.2	Installation Badewassertechnik	50	27.01.25 08:00	04.04.25 17:00	0
45.3	Rohrleitungen BWT außen	14	03.02.25 08:00	20.02.25 17:00	0
45.4	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	15	21.02.25 08:00	13.03.25 17:00	0
45.5	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	7.5	14.03.25 08:00	25.03.25 12:00	0
45.6	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	7.5	25.03.25 13:00	03.04.25 17:00	0
45.7	Elektro Badewassertechnik MSR	30	21.02.25 08:00	03.04.25 17:00	0
46	**Ausbau+Fassade Umkleidegebäude**	**68**	**03.03.25 08:00**	**04.06.25 17:00**	**0**
46.1	VHF	60	03.03.25 08:00	23.05.25 17:00	0
46.2	Grobinstallation HLSE	15	03.03.25 08:00	21.03.25 17:00	0
46.3	Zementputz	5	03.03.25 08:00	07.03.25 17:00	0
46.4	Trockenbauarbeiten	37.38	21.03.25 16:00	14.05.25 10:00	0
46.5	Estricharbeiten	10	10.03.25 08:00	21.03.25 17:00	0
46.6	Abdichtung + Fliesen	20	24.03.25 08:00	18.04.25 17:00	0
46.7	Feininstallation/Endmontage HLSE	10	21.04.25 08:00	02.05.25 17:00	0
46.8	Ausbauarbeiten Umkleiden	15	05.05.25 08:00	23.05.25 17:00	0
46.9	PVT-Anlage Materialbeschaffung	30	10.04.25 08:00	21.05.25 17:00	0
46.10	PVT-Anlage Montage	10	22.05.25 08:00	04.06.25 17:00	0
46.11	Blitzschutz	10	10.04.25 08:00	23.04.25 17:00	0
46.12	Malerarbeiten	15	05.05.25 08:00	23.05.25 17:00	0
47	**Schlosserarbeiten**	**25**	**03.03.25 08:00**	**04.04.25 17:00**	**0**
47.1	Tore vor Einzelumkleidebereich	10	03.03.25 08:00	14.03.25 17:00	0
47.2	Geländer+Absturzsicherungen	10	13.03.25 08:00	26.03.25 17:00	0
47.3	Stahltreppe Technikraum KIB	10	24.03.25 08:00	04.04.25 17:00	0
48	**Außenanlagen**	**55**	**31.03.25 08:00**	**13.06.25 17:00**	**0**
48.1	Pflasterarbeiten Beckenumgänge ABS	40	31.03.25 08:00	23.05.25 17:00	0
48.2	Pflasterarbeiten Wege F5+	40	21.04.25 08:00	13.06.25 17:00	0
48.3	Anlegen der Pflanzstreifen u. Pflanzarbeiten ???	20	10.04.25 13:00	08.05.25 12:00	0
48.4	Rasenansaat Liegeflächen ???	15	05.05.25 08:00	23.05.25 17:00	0
49	**Förmliche Abnahmen**	**39**	**01.04.25 08:00**	**23.05.25 17:00**	**0**
49.1	Vorbegehung mit Firmen, Installationstests Elektro	14	01.04.25 15:00	21.04.25 15:00	0
49.2	Förmliche Abnahme Elektro	10	21.04.25 15:00	05.05.25 15:00	0
49.3	Sanitärleitungen spülen + Hygieneabnahmen	14	01.04.25 08:00	18.04.25 17:00	0
49.4	Förmliche Abnahmen Sanitär	10	21.04.25 08:00	02.05.25 17:00	0
49.5	BWT -Leitungen spülen	14	04.04.25 08:00	23.04.25 17:00	0
49.6	BWT Färbeversuchmit Gesundheitsamt	14	04.04.25 08:00	23.04.25 17:00	0
49.7	BWT Haarfangtest	14	04.04.25 08:00	23.04.25 17:00	0
49.8	Probelauf + Färbeversuch	10	24.04.25 08:00	07.05.25 17:00	0
49.9	Förmliche Abnahmen BWT	10	24.04.25 08:00	07.05.25 17:00	0
49.10	Förmliche Abnahmen Chlorgasanlage (TÜV)	14	01.04.25 08:00	18.04.25 17:00	0
49.11	Förmliche Abnahme Heizung / PVT	10	01.04.25 13:00	15.04.25 12:00	0
49.12	TÜV-Prüfungen Sprunganlagen + Rutsche	10	12.05.25 08:00	23.05.25 17:00	0
49.13	Sachverständigenabnahme Edelstahlbecken (TÜ...	5	18.04.25 08:00	24.04.25 17:00	0
50	Reinigungsarbeiten	30	21.03.25 08:00	01.05.25 17:00	0
51	Eröffnung	0	13.06.25 17:00	13.06.25 17:00	0
52	Pufferzeit aus Ausfallzeiten	9	16.06.25 08:00	26.06.25 17:00	0
53	Verwendungsnachweis	120	16.06.25 08:00	28.11.25 17:00	0
54	..	1	10.07.23 08:00	10.07.23 17:00	100
55	..	1	10.07.23 08:00	10.07.23 17:00	0

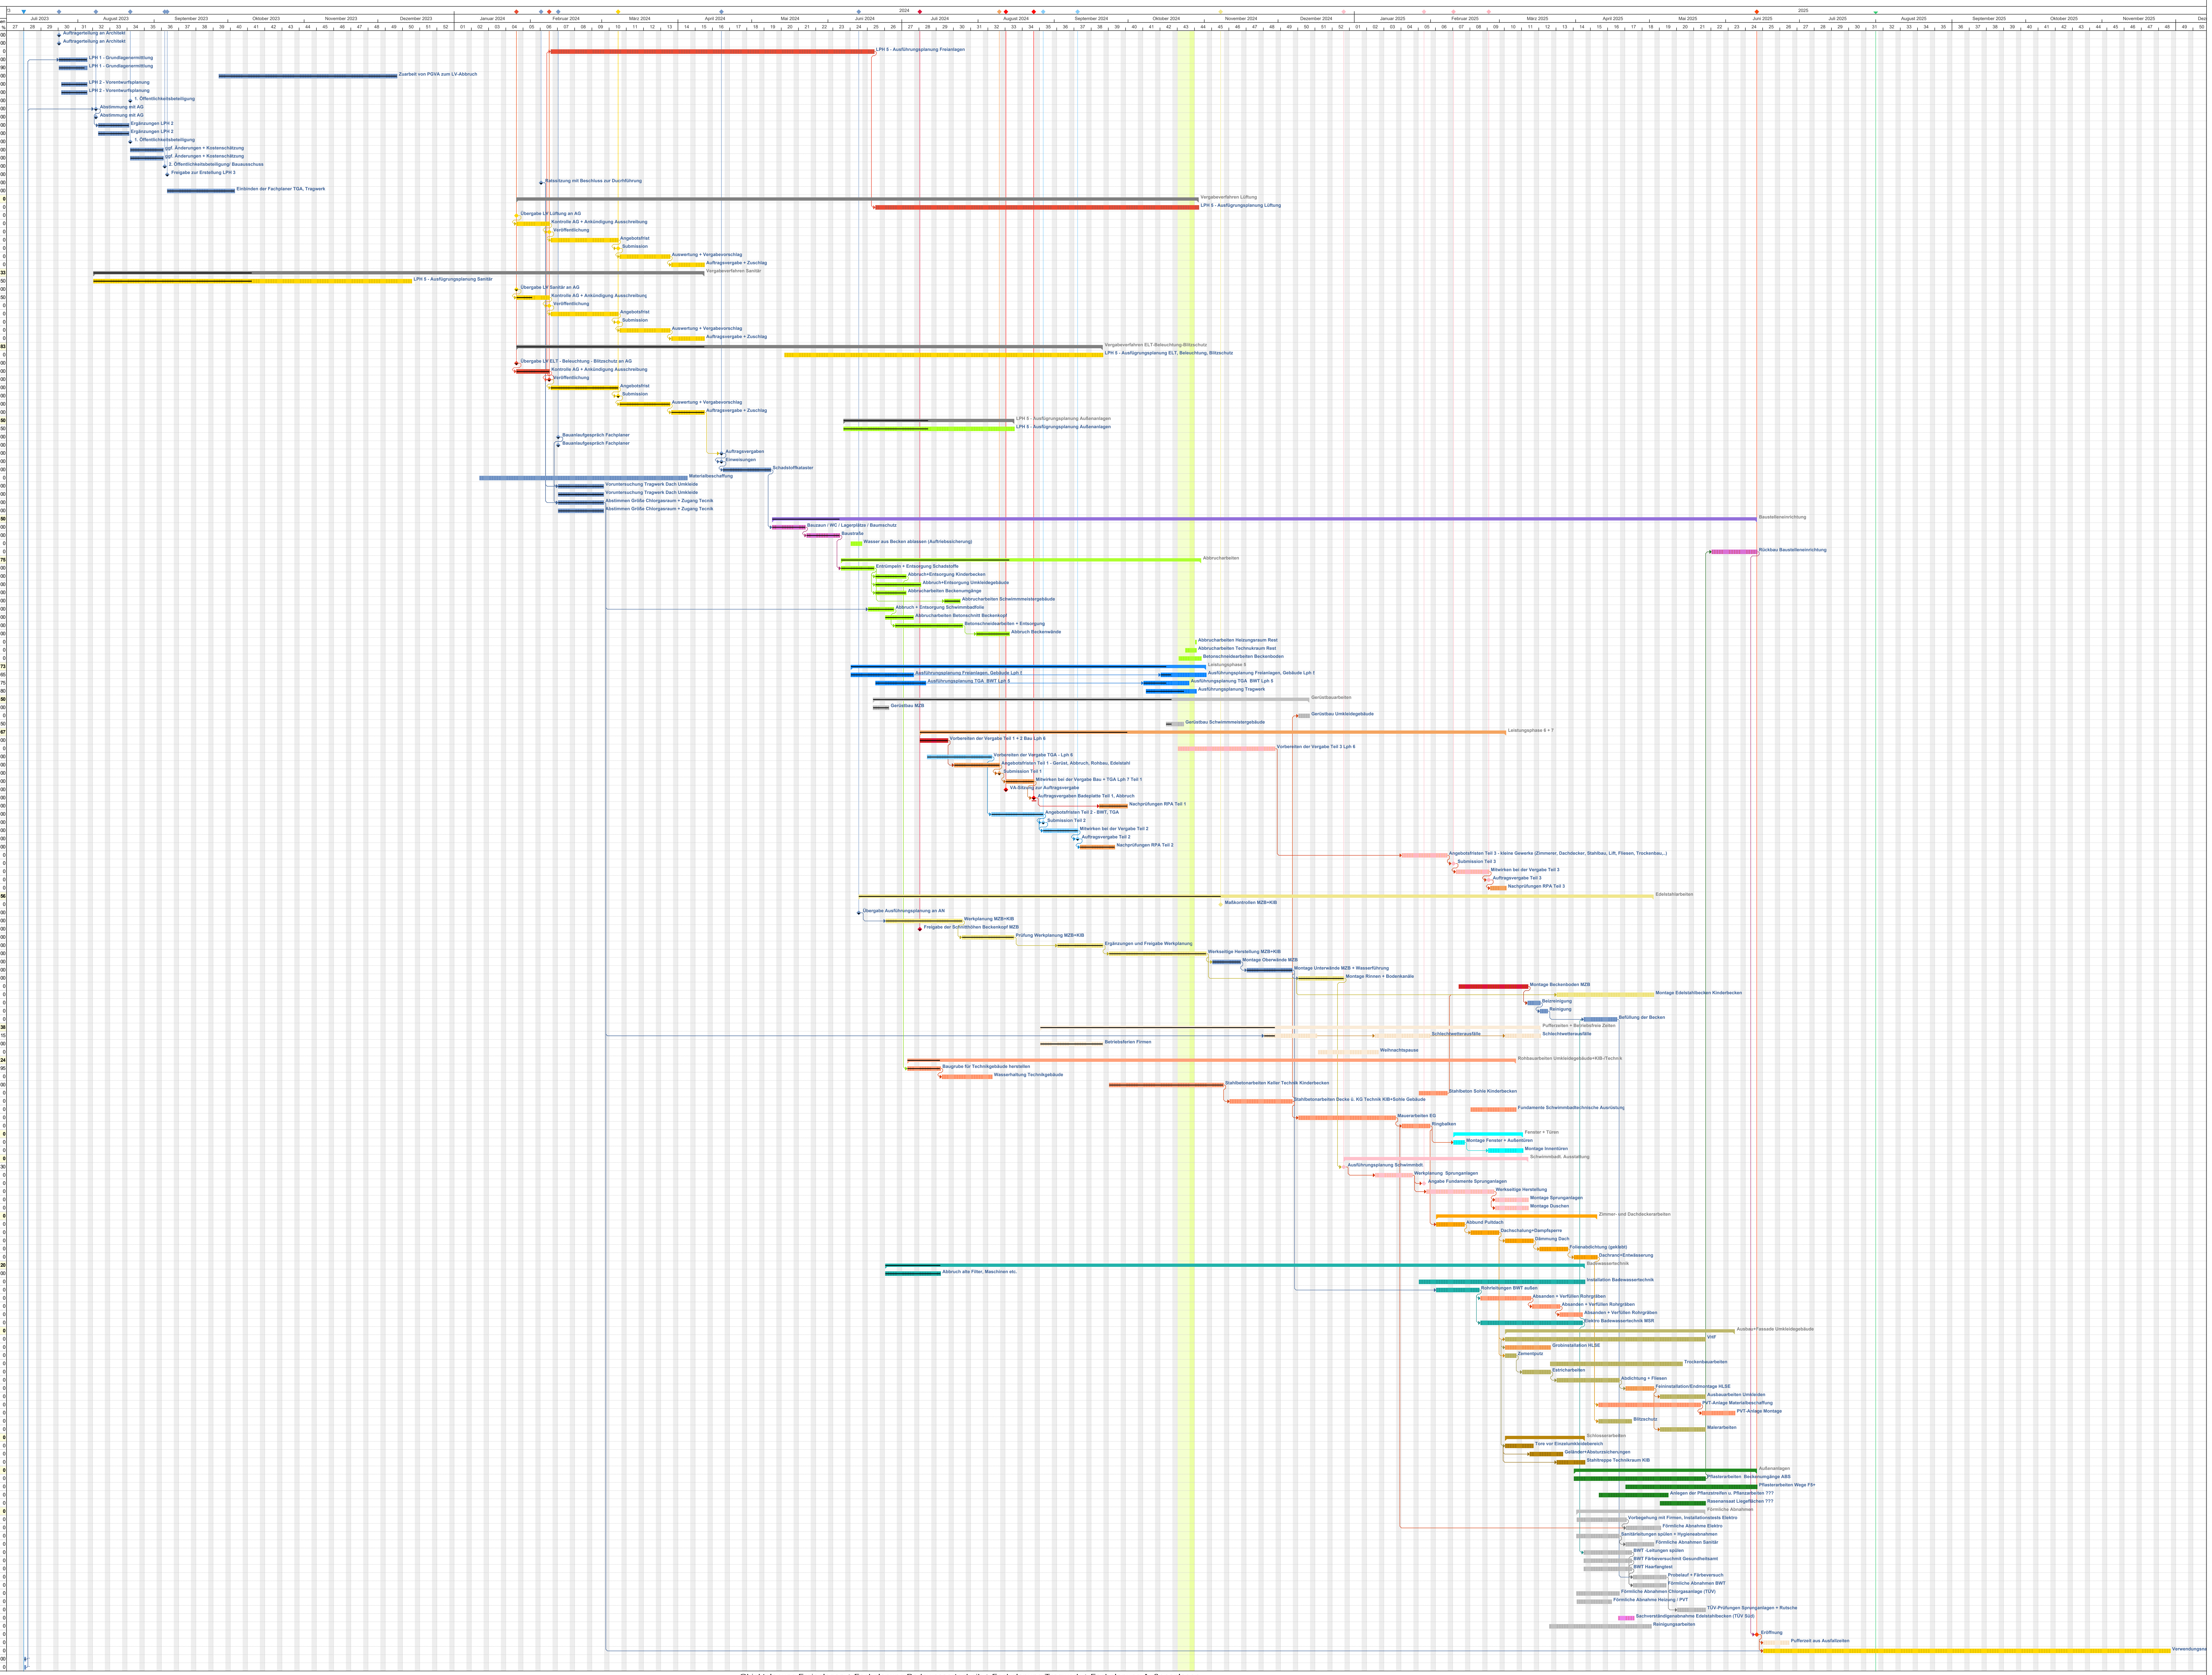

Objektplanung Freianlagen + Fachplanung Badewassertechnik + Fachplanung Tragwerk + Fachplanung Außenanlagen
