Planung der Planung (Bauzeit)
Freibad Erleborn

Stichtag: 10.07.23 00:00
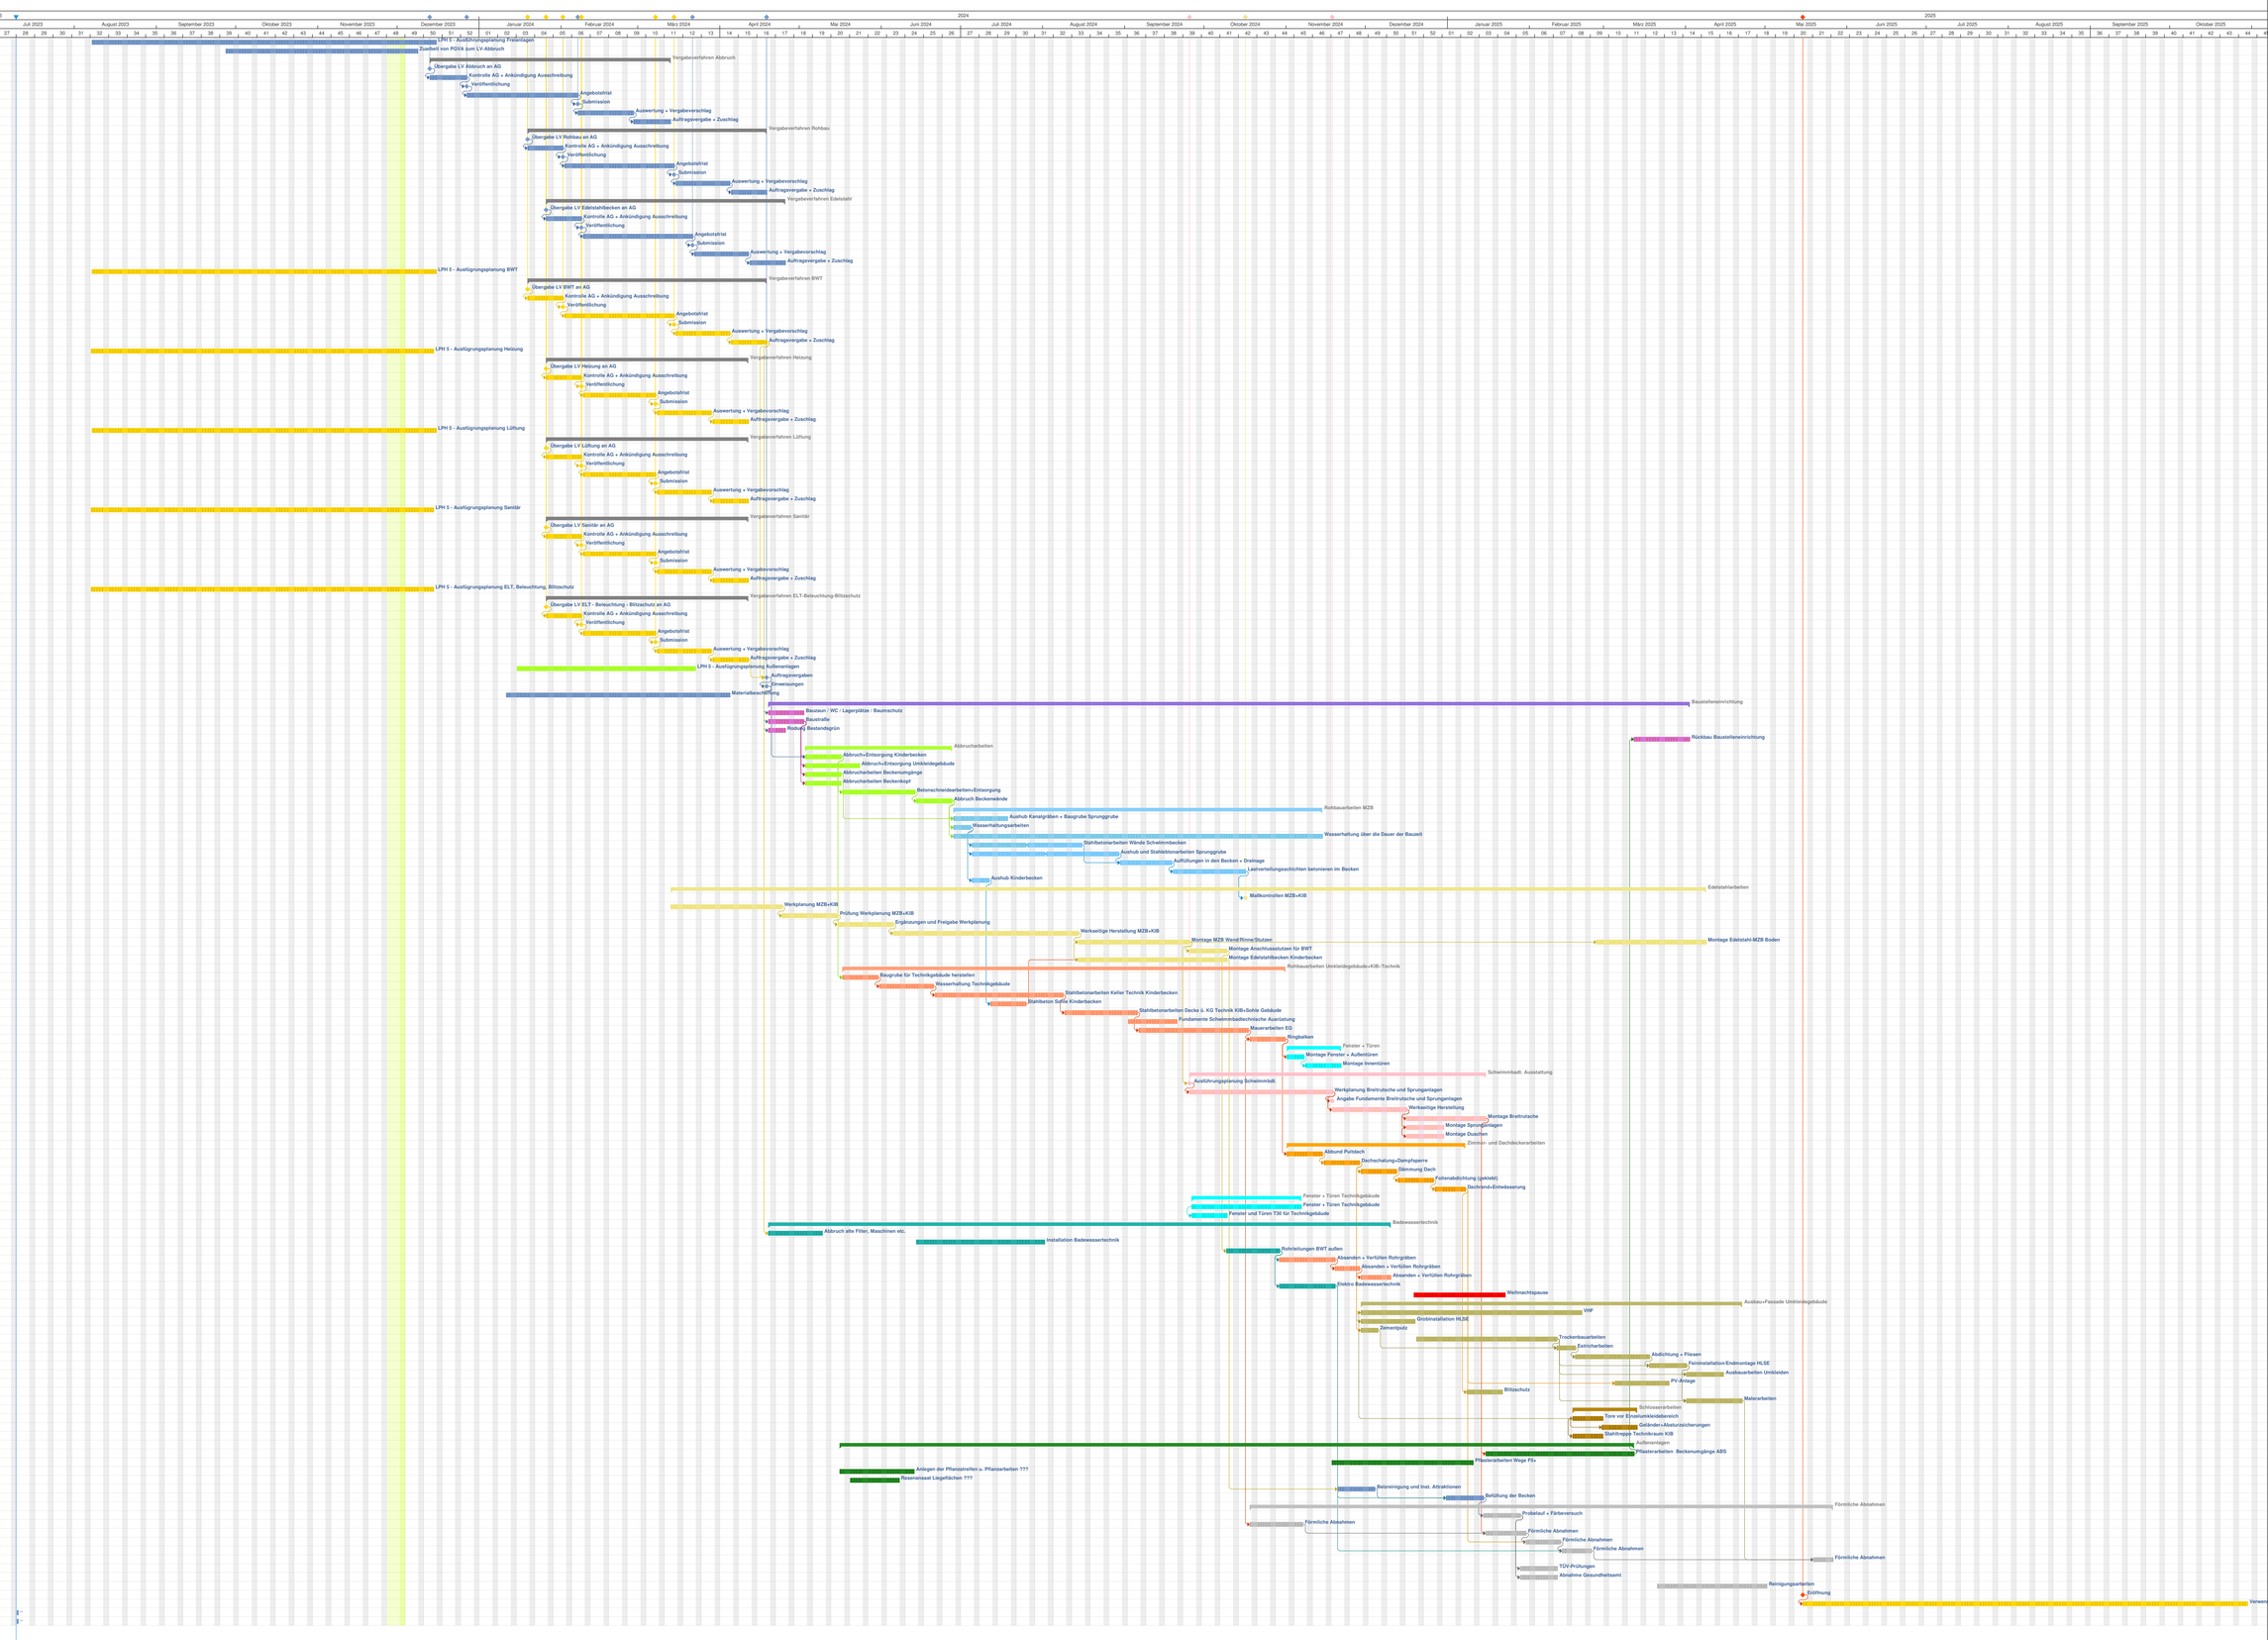
Nr.	Name	Dauer	Anfang	Ende	Abgeschlossen
		AT			
1	LPH 5 - Ausführungsplanung Freianlagen	94	07.08.23 16:00	15.12.23 16:00	0
2	Zuarbeit von PGVA zum LV-Abbruch	53	27.09.23 08:00	08.12.23 17:00	0
3	**Vergabeverfahren Abbruch**	**65**	**13.12.23 11:00**	**13.03.24 11:00**	**0**
3.1	Übergabe LV Abbruch an AG	0	13.12.23 11:00	13.12.23 11:00	0
3.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	13.12.23 11:00	27.12.23 11:00	0
3.3	Veröffentlichung	0	27.12.23 11:00	27.12.23 11:00	0
3.4	Angebotsfrist	30	27.12.23 11:00	07.02.24 11:00	0
3.5	Submission	0	07.02.24 11:00	07.02.24 11:00	0
3.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15	07.02.24 11:00	28.02.24 11:00	0
3.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	28.02.24 11:00	13.03.24 11:00	0
11	**Vergabeverfahren Rohbau**	**60**	**15.01.24 08:00**	**18.04.24 17:00**	**0**
11.1	Übergabe LV Rohbau an AG	0	19.01.24 08:00	19.01.24 08:00	0
11.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	19.01.24 08:00	01.02.24 17:00	0
11.3	Veröffentlichung	0	01.02.24 17:00	01.02.24 17:00	0
11.4	Angebotsfrist	30	02.02.24 08:00	14.03.24 17:00	0
11.5	Submission	0	14.03.24 17:00	14.03.24 17:00	0
11.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15	15.03.24 08:00	04.04.24 17:00	0
11.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	05.04.24 08:00	18.04.24 17:00	0
19	**Vergabeverfahren Edelstahl**	**65**	**26.01.24 08:00**	**25.04.24 17:00**	**0**
19.1	Übergabe LV Edelstahlbecken an AG	0	26.01.24 08:00	26.01.24 08:00	0
19.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	26.01.24 08:00	08.02.24 17:00	0
19.3	Veröffentlichung	0	08.02.24 17:00	08.02.24 17:00	0
19.4	Angebotsfrist	30	09.02.24 08:00	21.03.24 17:00	0
19.5	Submission	0	21.03.24 17:00	21.03.24 17:00	0
19.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15	22.03.24 08:00	11.04.24 17:00	0
19.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	12.04.24 08:00	25.04.24 17:00	0
27	LPH 5 - Ausführungsplanung BWT	94	07.08.23 16:00	15.12.23 16:00	0
28	**Vergabeverfahren BWT**	**65**	**19.01.24 08:00**	**18.04.24 17:00**	**0**
28.1	Übergabe LV BWT an AG	0	19.01.24 08:00	19.01.24 08:00	0
28.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	19.01.24 08:00	01.02.24 17:00	0
28.3	Veröffentlichung	0	01.02.24 17:00	01.02.24 17:00	0
28.4	Angebotsfrist	30	02.02.24 08:00	14.03.24 17:00	0
28.5	Submission	0	14.03.24 17:00	14.03.24 17:00	0
28.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15	15.03.24 08:00	04.04.24 17:00	0
28.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	05.04.24 08:00	18.04.24 17:00	0
36	LPH 5 - Ausführungsplanung Heizung	94	07.08.23 08:00	14.12.23 17:00	0
37	**Vergabeverfahren Heizung**	**55**	**26.01.24 08:00**	**11.04.24 17:00**	**0**
37.1	Übergabe LV Heizung an AG	0	26.01.24 08:00	26.01.24 08:00	0
37.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	26.01.24 08:00	08.02.24 17:00	0
37.3	Veröffentlichung	0	08.02.24 17:00	08.02.24 17:00	0
37.4	Angebotsfrist	20	09.02.24 08:00	07.03.24 17:00	0
37.5	Submission	0	07.03.24 17:00	07.03.24 17:00	0
37.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15	08.03.24 08:00	28.03.24 17:00	0
37.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	29.03.24 08:00	11.04.24 17:00	0
45	LPH 5 - Ausführungsplanung Lüftung	94	07.08.23 16:00	15.12.23 16:00	0
46	**Vergabeverfahren Lüftung**	**55**	**26.01.24 08:00**	**11.04.24 17:00**	**0**
46.1	Übergabe LV Lüftung an AG	0	26.01.24 08:00	26.01.24 08:00	0
46.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	26.01.24 08:00	08.02.24 17:00	0
46.3	Veröffentlichung	0	08.02.24 17:00	08.02.24 17:00	0
46.4	Angebotsfrist	20	09.02.24 08:00	07.03.24 17:00	0
46.5	Submission	0	07.03.24 17:00	07.03.24 17:00	0
46.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15	08.03.24 08:00	28.03.24 17:00	0
46.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	29.03.24 08:00	11.04.24 17:00	0
54	LPH 5 - Ausführungsplanung Sanitär	94	07.08.23 08:00	14.12.23 17:00	0
55	**Vergabeverfahren Sanitär**	**55**	**26.01.24 08:00**	**11.04.24 17:00**	**0**
55.1	Übergabe LV Sanitär an AG	0	26.01.24 08:00	26.01.24 08:00	0
55.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	26.01.24 08:00	08.02.24 17:00	0
55.3	Veröffentlichung	0	08.02.24 17:00	08.02.24 17:00	0
55.4	Angebotsfrist	20	09.02.24 08:00	07.03.24 17:00	0
55.5	Submission	0	07.03.24 17:00	07.03.24 17:00	0
55.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15	08.03.24 08:00	28.03.24 17:00	0
55.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	29.03.24 08:00	11.04.24 17:00	0
63	LPH 5 - Ausführungsplanung ELT, Beleuchtung, Blit	94	07.08.23 08:00	14.12.23 17:00	0
64	**Vergabeverfahren ELT-Beleuchtung-Blitzschutz**	**55**	**26.01.24 08:00**	**11.04.24 17:00**	**0**
64.1	Übergabe LV ELT - Beleuchtung - Blitzschutz an AG	0	26.01.24 08:00	26.01.24 08:00	0
64.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10	26.01.24 08:00	08.02.24 17:00	0
64.3	Veröffentlichung	0	08.02.24 17:00	08.02.24 17:00	0
64.4	Angebotsfrist	20	09.02.24 08:00	07.03.24 17:00	0
64.5	Submission	0	07.03.24 17:00	07.03.24 17:00	0
64.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15	08.03.24 08:00	28.03.24 17:00	0
64.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10	29.03.24 08:00	11.04.24 17:00	0
72	LPH 5 - Ausführungsplanung Außenanlagen	50	15.01.24 08:00	22.03.24 17:00	0
77	Auftragsvergaben	0	18.04.24 17:00	18.04.24 17:00	0
78	Einweisungen	0	18.04.24 17:00	18.04.24 17:00	0
79	Materialbeschaffung	61	11.01.24 08:00	04.04.24 17:00	0
80	**Baustelleneinrichtung**	**248.5**	**19.04.24 08:00**	**02.04.25 12:00**	**0**
80.1	Bauzaun / WC / Lagerplätze / Baumschutz	10	19.04.24 08:00	02.05.24 17:00	0
80.2	Baustraße	10	19.04.24 08:00	02.05.24 17:00	0
80.3	Rodung Restbestände	5	19.04.24 08:00	25.04.24 17:00	0
80.4	Rückbau Baustelleneinrichtung	15	12.03.25 13:00	02.04.25 12:00	0
81	**Abbrucharbeiten**	**40**	**03.05.24 08:00**	**27.06.24 17:00**	**0**
81.1	Abbruch+Entsorgung Kinderbecken	10	03.05.24 08:00	16.05.24 17:00	0
81.2	Abbruch+Entsorgung Umkleidegebäude	15	03.05.24 08:00	23.05.24 17:00	0
81.5	Abbrucharbeiten Beckenumgänge	10	03.05.24 08:00	16.05.24 17:00	0
81.6	Abbrucharbeiten Beckenkopf	10	03.05.24 08:00	16.05.24 17:00	0
81.8	Betonschneidearbeiten+Entsorgung	20	17.05.24 08:00	13.06.24 17:00	0
81.9	Abbruch Beckenwände	10	14.06.24 08:00	27.06.24 17:00	0
82	**Rohbauarbeiten MZB**	**100**	**28.06.24 08:00**	**14.11.24 17:00**	**0**
82.1	Aushub Kanalgräben + Baugrube Sprunggrube	15	28.06.24 08:00	18.07.24 17:00	0
82.2	Wasserhaltungsarbeiten	5	28.06.24 08:00	04.07.24 17:00	0
82.3	Wasserhaltung über die Dauer der Bauzeit	100	28.06.24 08:00	14.11.24 17:00	0
82.4	Stahlbetonarbeiten Wände Schwimmbecken	30	05.07.24 08:00	15.08.24 17:00	0
82.7	Aushub und Stahlbetonarbeiten Sprunggrube	40	05.07.24 08:00	29.08.24 17:00	0
82.9	Auffüllungen in den Becken + Drainage	14	30.08.24 08:00	18.09.24 17:00	0
82.10	Lastverteilungsschichten betonieren im Becken	20	19.09.24 08:00	16.10.24 17:00	0
83	Aushub Kinderbecken	5	05.07.24 08:00	11.07.24 17:00	0
84	**Edelstahlarbeiten**	**275.5**	**13.03.24 13:00**	**06.04.25 17:00**	**0**
84.1	Maßkontrollen MZB+KIB	0	16.10.24 17:00	16.10.24 17:00	0
84.2	Werkplanung MZB+KIB	30	13.03.24 13:00	24.04.24 12:00	0
84.3	Prüfung Werkplanung MZB+KIB	15	24.04.24 13:00	15.05.24 12:00	0
84.4	Ergänzungen und Freigabe Werkplanung	15	15.05.24 13:00	05.06.24 12:00	0
84.5	Werkseitige Herstellung MZB+KIB	50	05.06.24 13:00	14.08.24 12:00	0
84.6	Montage MZB Wand Rinne Stutzen	60	14.08.24 13:00	08.04.25 17:00	0
85	Montage Anschlussstutzen für BWT	10	25.09.24 13:00	09.10.24 12:00	0
86	Montage Edelstahlbecken Kinderbecken	40	14.08.24 13:00	09.10.24 12:00	0
87	**Rohbauarbeiten Umkleidegebäude+KIB-Technik**	**120**	**17.05.24 08:00**	**31.10.24 17:00**	**0**
87.1	Baugrube für Technikgebäude herstellen	10	17.05.24 08:00	30.05.24 17:00	0
87.2	Wasserhaltung Technikgebäude	15	31.05.24 08:00	20.06.24 17:00	0
87.3	Stahlbetonarbeiten Keller Technik Kinderbecken	35	21.06.24 08:00	06.08.24 17:00	0
87.5	Stahlbeton Sohle Kinderbecken	10	12.07.24 08:00	25.07.24 17:00	0
87.6	Stahlbetonarbeiten Decke ü. KG Technik KIB+Sohl	20	09.08.24 08:00	05.09.24 17:00	0
87.7	Fundamente Schwimmbadtechnische Ausrüstung	15	02.09.24 08:00	20.09.24 17:00	0
87.8	Mauerarbeiten EG	30	06.09.24 08:00	17.10.24 17:00	0
87.9	Ringbalken	10	18.10.24 08:00	31.10.24 17:00	0
88	**Fenster + Türen**	**15**	**01.11.24 08:00**	**21.11.24 17:00**	**0**
88.1	Montage Fenster + Außentüren	5	01.11.24 08:00	07.11.24 17:00	0
88.2	Montage Innentüren	10	08.11.24 08:00	21.11.24 17:00	0
89	**Schwimmbadt. Ausstattung**	**80**	**25.09.24 12:00**	**15.01.25 12:00**	**0**
89.1	Ausführungsplanung Schwimmbdt.	0	25.09.24 12:00	25.09.24 12:00	0
89.2	Werkplanung Breitrutsche und Sprunganlagen	36	25.09.24 13:00	18.11.24 12:00	0
89.3	Angabe Fundamente Breitrutsche und Sprungania...	0	18.11.24 12:00	18.11.24 12:00	0
89.4	Werkseitige Herstellung	20	18.11.24 13:00	16.12.24 12:00	0
89.5	Montage Breitrutsche	22	16.12.24 13:00	15.01.25 12:00	0
89.6	Montage Sprunganlagen	10	16.12.24 13:00	30.12.24 12:00	0
89.7	Montage Duschen	10	16.12.24 13:00	30.12.24 12:00	0
90	**Zimmer- und Dachdeckerarbeiten**	**40**	**01.11.24 08:00**	**07.01.25 17:00**	**0**
90.2	Abbund Pultdach	10	01.11.24 08:00	14.11.24 17:00	0
90.3	Dachschalung+Dampfsperre	10	15.11.24 08:00	28.11.24 17:00	0
90.4	Dämmung Dach	10	29.11.24 08:00	12.12.24 17:00	0
90.5	Folienabdichtung (geklebt)	10	13.12.24 08:00	26.12.24 17:00	0
90.6	Dachrinnen-Entwässerung	8	27.12.24 08:00	07.01.25 17:00	0
100	**Fenster + Türen Technikgebäude**	**30**	**26.09.24 08:00**	**06.11.24 17:00**	**0**
100.1	Fenster + Türen Technikgebäude	30	26.09.24 08:00	06.11.24 17:00	0
100.2	Fenster und Türen T30 für Technikgebäude	10	26.09.24 08:00	09.10.24 17:00	0
102	**Badewassertechnik**	**167.5**	**19.04.24 08:00**	**10.12.24 12:00**	**0**
102.1	Abbruch alte Filter, Maschinen etc.	15	19.04.24 08:00	09.05.24 17:00	0
102.2	Installation Badewassertechnik	35	14.06.24 08:00	01.08.24 17:00	0
102.3	Rohrleitungen BWT außen	14	09.10.24 13:00	29.10.24 12:00	0
102.4	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	15	29.10.24 13:00	19.11.24 12:00	0
102.5	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	7.5	19.11.24 13:00	28.11.24 17:00	0
102.6	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	7.5	29.11.24 08:00	10.12.24 12:00	0
102.7	Elektro Badewassertechnik	15	29.10.24 13:00	19.11.24 12:00	0
106	Weihnachtspause	25	19.12.24 08:00	22.01.25 17:00	0
107	**Ausbau+Fassade Umkleidegebäude**	**102.38**	**29.11.24 08:00**	**22.04.25 11:00**	**0**
107.1	VHF	60	29.11.24 08:00	20.02.25 17:00	0
107.2	Grobinstallation HLSE	15	29.11.24 08:00	19.12.24 17:00	0
107.3	Zementputz	5	29.11.24 08:00	05.12.24 17:00	0
107.4	Trockenbauarbeiten	37.38	20.12.24 08:00	11.02.25 11:00	0
107.5	Estricharbeiten	5	11.02.25 11:00	18.02.25 11:00	0
107.6	Abdichtung + Fliesen	20	18.02.25 11:00	18.03.25 11:00	0
107.7	Feininstallation/Endmontage HLSE	10	18.03.25 11:00	01.04.25 11:00	0
107.8	Ausbauarbeiten Umkleiden	10	01.04.25 11:00	15.04.25 11:00	0
107.9	PV-Anlage	15	05.03.25 08:00	25.03.25 17:00	0
107...	Blitzschutz	10	06.01.25 08:00	21.01.25 17:00	0
107...	Malerarbeiten	15	01.04.25 11:00	22.04.25 11:00	0
108	**Schlosserarbeiten**	**19**	**17.02.25 08:00**	**13.03.25 17:00**	**0**
108.1	Tore vor Einsatzumkleidebereich	10	17.02.25 08:00	28.02.25 17:00	0
108.2	Geländer+Absturzsicherungen	10	28.02.25 08:00	13.03.25 17:00	0
108.3	Stahltreppe Technikraum KIB	10	17.02.25 08:00	28.02.25 17:00	0
124	**Außenanlagen**	**214.13**	**16.05.24 11:00**	**12.03.25 12:00**	**0**
124.1	Pflasterarbeiten Beckenumgänge ABS	40	15.01.25 13:00	12.03.25 12:00	0
124.2	Pflasterarbeiten Wege FS+	40	18.11.24 08:00	10.01.25 17:00	0
124.3	Anlegen der Pflanzstreifen u. Pflanzarbeiten ???	20	16.05.24 11:00	13.06.24 11:00	0
124.4	Rasensaat Liegeflächen ???	15	20.05.24 08:00	07.06.24 17:00	0
125	Beizreinigung und Inst. Attraktionen	10	20.11.24 13:00	04.12.24 12:00	0
126	Befüllung der Becken	10	31.12.24 13:00	14.01.25 12:00	0
127	**Förmliche Abnahmen**	**156.88**	**18.10.24 08:00**	**26.05.25 16:00**	**0**
127.1	Probelauf + Färbeversuch	10	14.01.25 13:00	28.01.25 12:00	0
127.2	Förmliche Abnahmen	14.25	18.10.24 08:00	07.11.24 10:00	0
127.3	Förmliche Abnahmen	11.38	15.01.25 13:00	30.01.25 16:00	0
127.4	Förmliche Abnahmen	9.13	30.01.25 16:00	12.02.25 17:00	0
127.5	Förmliche Abnahmen	7.38	13.02.25 08:00	24.02.25 11:00	0
127.6	Förmliche Abnahmen	5.88	19.05.25 08:00	26.05.25 16:00	0
127.8	TÜV-Prüfungen	10	28.01.25 13:00	11.02.25 12:00	0
127.9	Abnahme Gesundheitsamt	10	28.01.25 13:00	11.02.25 12:00	0
128	Reinigungsarbeiten	30	21.03.25 08:00	01.05.25 17:00	0
129	Eröffnung	0	15.05.25 11:00	15.05.25 11:00	0
130	Verwendungsnachweis	120	15.05.25 11:00	30.10.25 11:00	0
131	..	1	10.07.23 08:00	10.07.23 17:00	0
132	..	1	10.07.23 08:00	10.07.23 17:00	0
