<[project start_date]
<[project finish_date]

Planung der Planung (Bauzeit)
Freibad Erleborn

23.

Stichtag: 10.07.23 00:00
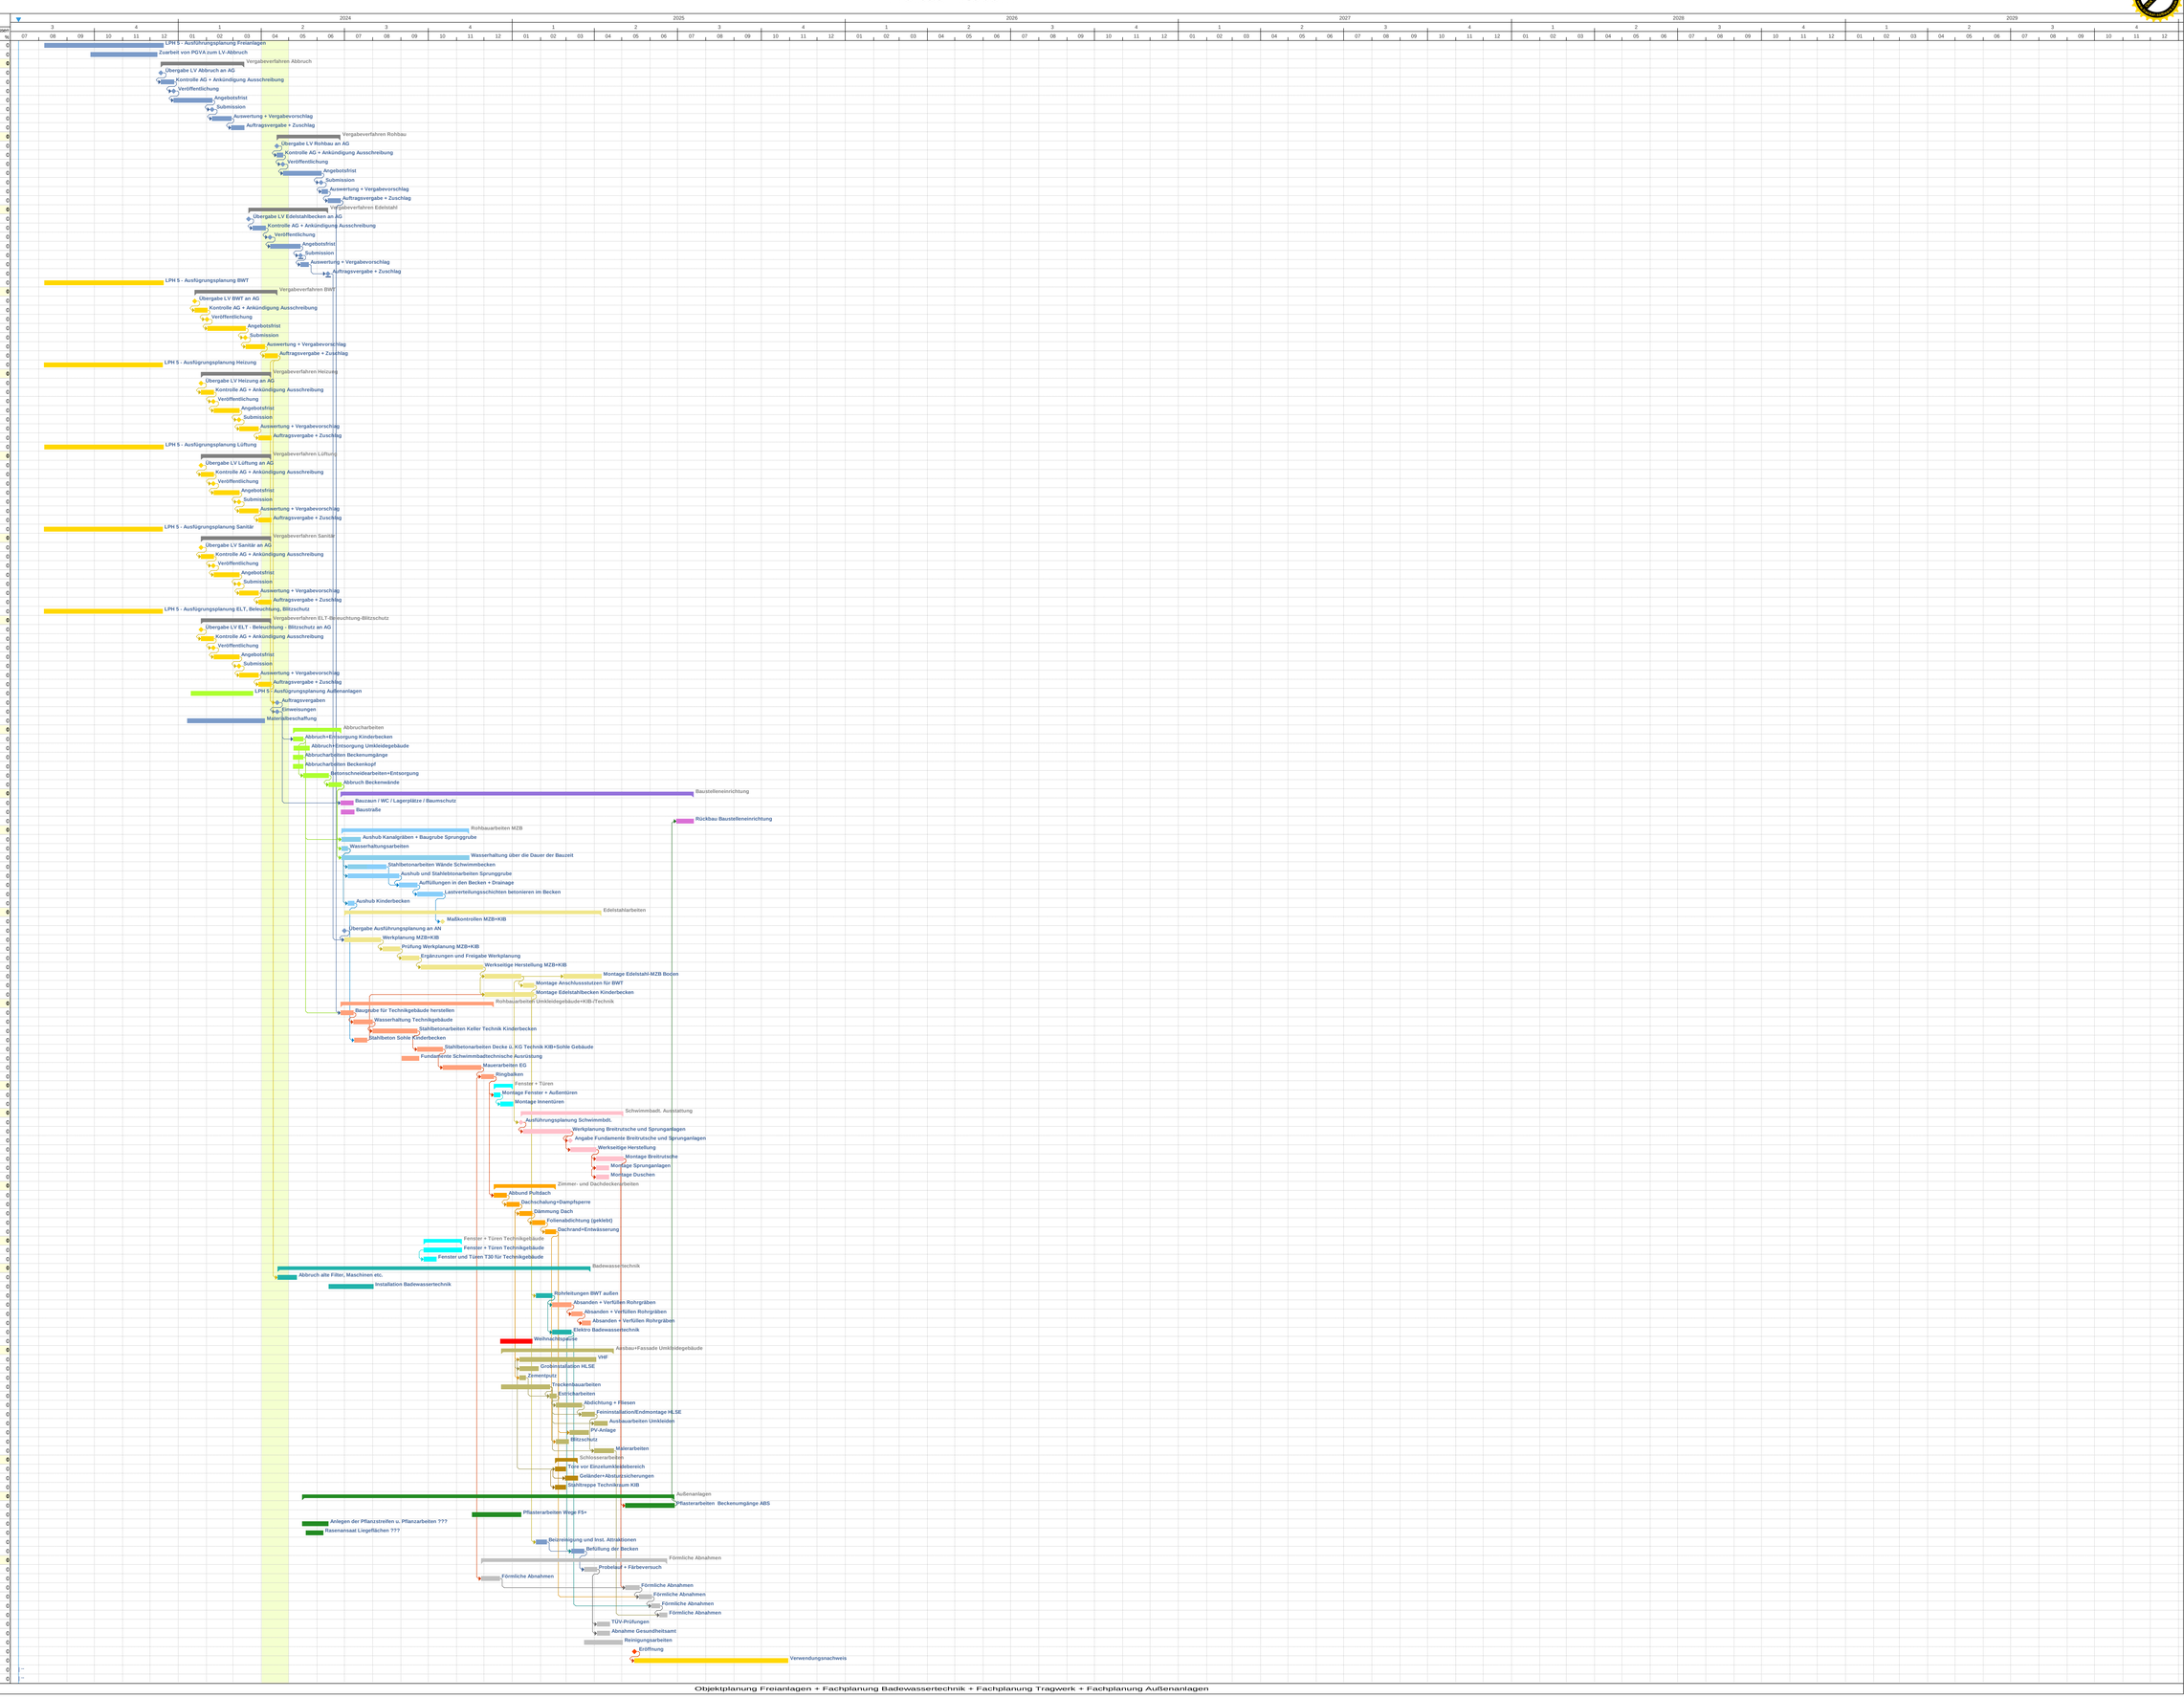
Nr.	Name	Dauer AT	Anfang	Ende	Abgeschlossen %
1	LPH 5 - Ausführungsplanung Freianlagen	94 07.08.23 16:00	15.12.23 16:00		0
2	Zuarbeit von PGVA zum LV-Abbruch	53 27.09.23 08:00	08.12.23 17:00		0
3	**Vergabeverfahren Abbruch**	**65 13.12.23 11:00**	**13.03.24 11:00**		**0**
3.1	Übergabe LV Abbruch an AG	0 13.12.23 11:00	13.12.23 11:00		0
3.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10 13.12.23 11:00	27.12.23 11:00		0
3.3	Veröffentlichung	0 27.12.23 11:00	27.12.23 11:00		0
3.4	Angebotsfrist	30 27.12.23 11:00	07.02.24 11:00		0
3.5	Submission	0 07.02.24 11:00	07.02.24 11:00		0
3.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15 07.02.24 11:00	28.02.24 11:00		0
3.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10 28.02.24 11:00	13.03.24 11:00		0
11	**Vergabeverfahren Rohbau**	**50 18.04.24 08:00**	**26.06.24 17:00**		**0**
11.1	Übergabe LV Rohbau an AG	0 18.04.24 08:00	18.04.24 08:00		0
11.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	5 18.04.24 08:00	24.04.24 17:00		0
11.3	Veröffentlichung	0 24.04.24 17:00	24.04.24 17:00		0
11.4	Angebotsfrist	30 25.04.24 08:00	05.06.24 17:00		0
11.5	Submission	0 05.06.24 17:00	05.06.24 17:00		0
11.6	Auswertung + Vergabevorschlag	5 06.06.24 08:00	12.06.24 17:00		0
11.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10 13.06.24 08:00	26.06.24 17:00		0
19	**Vergabeverfahren Edelstahl**	**63 18.03.24 08:00**	**13.06.24 08:00**		**0**
19.1	Übergabe LV Edelstahlbecken an AG	0 18.03.24 08:00	18.03.24 08:00		0
19.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10 22.03.24 13:00	05.04.24 12:00		0
19.3	Veröffentlichung	0 10.04.24 17:00	10.04.24 17:00		0
19.4	Angebotsfrist	23 11.04.24 08:00	13.05.24 17:00		0
19.5	Submission	0 14.05.24 08:00	14.05.24 08:00		0
19.6	Auswertung + Vergabevorschlag	7 14.05.24 08:00	22.05.24 17:00		0
19.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	0 13.06.24 08:00	13.06.24 08:00		0
27	LPH 5 - Ausführungsplanung BWT	94 07.08.23 16:00	15.12.23 16:00		0
28	**Vergabeverfahren BWT**	**65 19.01.24 08:00**	**18.04.24 17:00**		**0**
28.1	Übergabe LV BWT an AG	0 19.01.24 08:00	19.01.24 08:00		0
28.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10 19.01.24 08:00	01.02.24 17:00		0
28.3	Veröffentlichung	0 01.02.24 17:00	01.02.24 17:00		0
28.4	Angebotsfrist	30 02.02.24 08:00	14.03.24 17:00		0
28.5	Submission	0 14.03.24 17:00	14.03.24 17:00		0
28.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15 15.03.24 08:00	04.04.24 17:00		0
28.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10 05.04.24 08:00	18.04.24 17:00		0
36	LPH 5 - Ausführungsplanung Heizung	94 07.08.23 08:00	14.12.23 17:00		0
37	**Vergabeverfahren Heizung**	**55 26.01.24 08:00**	**11.04.24 17:00**		**0**
37.1	Übergabe LV Heizung an AG	0 26.01.24 08:00	26.01.24 08:00		0
37.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10 26.01.24 08:00	08.02.24 17:00		0
37.3	Veröffentlichung	0 08.02.24 17:00	08.02.24 17:00		0
37.4	Angebotsfrist	20 09.02.24 08:00	07.03.24 17:00		0
37.5	Submission	0 07.03.24 17:00	07.03.24 17:00		0
37.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15 08.03.24 08:00	28.03.24 17:00		0
37.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10 29.03.24 08:00	11.04.24 17:00		0
45	LPH 5 - Ausführungsplanung Lüftung	94 07.08.23 16:00	15.12.23 16:00		0
46	**Vergabeverfahren Lüftung**	**55 26.01.24 08:00**	**11.04.24 17:00**		**0**
46.1	Übergabe LV Lüftung an AG	0 26.01.24 08:00	26.01.24 08:00		0
46.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10 26.01.24 08:00	08.02.24 17:00		0
46.3	Veröffentlichung	0 08.02.24 17:00	08.02.24 17:00		0
46.4	Angebotsfrist	20 09.02.24 08:00	07.03.24 17:00		0
46.5	Submission	0 07.03.24 17:00	07.03.24 17:00		0
46.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15 08.03.24 08:00	28.03.24 17:00		0
46.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10 29.03.24 08:00	11.04.24 17:00		0
54	LPH 5 - Ausführungsplanung Sanitär	94 07.08.23 08:00	14.12.23 17:00		0
55	**Vergabeverfahren Sanitär**	**55 26.01.24 08:00**	**11.04.24 17:00**		**0**
55.1	Übergabe LV Sanitär an AG	0 26.01.24 08:00	26.01.24 08:00		0
55.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10 26.01.24 08:00	08.02.24 17:00		0
55.3	Veröffentlichung	0 08.02.24 17:00	08.02.24 17:00		0
55.4	Angebotsfrist	20 09.02.24 08:00	07.03.24 17:00		0
55.5	Submission	0 07.03.24 17:00	07.03.24 17:00		0
55.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15 08.03.24 08:00	28.03.24 17:00		0
55.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10 29.03.24 08:00	11.04.24 17:00		0
63	LPH 5 - Ausführungsplanung ELT, Beleuchtung, Bli...	94 07.08.23 08:00	14.12.23 17:00		0
64	**Vergabeverfahren ELT-Beleuchtung-Blitzschutz**	**55 26.01.24 08:00**	**11.04.24 17:00**		**0**
64.1	Übergabe LV ELT - Beleuchtung - Blitzschutz an AG	0 26.01.24 08:00	26.01.24 08:00		0
64.2	Kontrolle AG + Ankündigung Ausschreibung	10 26.01.24 08:00	08.02.24 17:00		0
64.3	Veröffentlichung	0 08.02.24 17:00	08.02.24 17:00		0
64.4	Angebotsfrist	20 09.02.24 08:00	07.03.24 17:00		0
64.5	Submission	0 07.03.24 17:00	07.03.24 17:00		0
64.6	Auswertung + Vergabevorschlag	15 08.03.24 08:00	28.03.24 17:00		0
64.7	Auftragsvergabe + Zuschlag	10 29.03.24 08:00	11.04.24 17:00		0
72	LPH 5 - Ausführungsplanung Außenanlagen	50 15.01.24 08:00	22.03.24 17:00		0
77	Auftragsvergaben	0 18.04.24 17:00	18.04.24 17:00		0
78	Einweisungen	0 18.04.24 17:00	18.04.24 17:00		0
79	Materialbeschaffung	61 11.01.24 08:00	04.04.24 17:00		0
80	**Abbrucharbeiten**	**39 06.05.24 08:00**	**27.06.24 17:00**		**0**
80.1	Abbruch+Entsorgung Kinderbecken	9 06.05.24 08:00	16.05.24 17:00		0
80.2	Abbruch+Entsorgung Umkleidegebäude	13 06.05.24 13:00	23.05.24 12:00		0
80.5	Abbrucharbeiten Beckenumgänge	9 06.05.24 08:00	16.05.24 17:00		0
80.6	Abbrucharbeiten Beckenkopf	9 06.05.24 08:00	16.05.24 17:00		0
80.8	Betonschneidearbeiten+Entsorgung	20 17.05.24 08:00	13.06.24 17:00		0
80.9	Abbruch Beckenwände	10 14.06.24 08:00	27.06.24 17:00		0
81	**Baustelleneinrichtung**	**277 27.06.24 08:00**	**18.07.25 17:00**		**0**
81.1	Bauzaun / WC / Lagerplätze / Baumschutz	10 27.06.24 08:00	10.07.24 17:00		0
81.2	Baustraße	10 27.06.24 13:00	11.07.24 12:00		0
81.4	Rückbau Baustelleneinrichtung	15 30.06.25 08:00	18.07.25 17:00		0
82	**Rohbauarbeiten MZB**	**100 28.06.24 08:00**	**14.11.24 17:00**		**0**
82.1	Aushub Kanalgräben + Baugrube Sprunggrube	15 28.06.24 08:00	18.07.24 17:00		0
82.2	Wasserhaltungsarbeiten	5 28.06.24 08:00	04.07.24 17:00		0
82.3	Wasserhaltung über die Dauer der Bauzeit	100 28.06.24 08:00	14.11.24 17:00		0
82.4	Stahlbetonarbeiten Wände Schwimmbecken	30 05.07.24 08:00	15.08.24 17:00		0
82.7	Aushub und Stahlbetonarbeiten Sprunggrube	40 05.07.24 08:00	29.08.24 17:00		0
82.9	Auffüllungen in den Becken + Drainage	14 30.08.24 08:00	18.09.24 17:00		0
82.10	Lastverteilungsschichten betonieren im Becken	20 19.09.24 08:00	16.10.24 17:00		0
83	Aushub Kinderbecken	5 05.07.24 08:00	11.07.24 17:00		0
84	**Edelstahlarbeiten**	**202 01.07.24 08:00**	**08.04.25 17:00**		**0**
84.1	Maßkontrollen MZB+KIB	0 16.10.24 17:00	16.10.24 17:00		0
84.2	Übergabe Ausführungsplanung an AN	0 01.07.24 08:00	01.07.24 08:00		0
84.3	Werkplanung MZB+KIB	30 01.07.24 08:00	09.08.24 17:00		0
84.4	Prüfung Werkplanung MZB+KIB	15 12.08.24 08:00	30.08.24 17:00		0
84.5	Ergänzungen und Freigabe Werkplanung	15 02.09.24 08:00	20.09.24 17:00		0
84.6	Werkseitige Herstellung MZB+KIB	50 23.09.24 08:00	29.11.24 17:00		0
84.7	Montage MZB Wand/Rinne/Stützen	60 02.12.24 08:00	08.04.25 17:00		0
85	Montage Anschlussstutzen für BWT	10 13.01.25 08:00	24.01.25 17:00		0
86	Montage Edelstahlbecken Kinderbecken	40 02.12.24 08:00	24.01.25 17:00		0
87	**Rohbauarbeiten Umkleidegebäude+KIB-iTechnik**	**120 27.06.24 08:00**	**11.12.24 17:00**		**0**
87.1	Baugrube für Technikgebäude herstellen	10 27.06.24 08:00	10.07.24 17:00		0
87.2	Wasserhaltung Technikgebäude	15 31.07.24 08:00	31.07.24 17:00		0
87.3	Stahlbetonarbeiten Keller Technik Kinderbecken	35 01.08.24 08:00	18.09.24 17:00		0
87.5	Stahlbeton Sohle Kinderbecken	10 12.07.24 08:00	25.07.24 17:00		0
87.6	Stahlbetonarbeiten Decke u. KG Technik KIB+Sohle	20 19.09.24 08:00	16.10.24 17:00		0
87.7	Fundamente Schwimmbadtechnische Ausrüstung	15 02.09.24 08:00	20.09.24 17:00		0
87.8	Mauerarbeiten EG	30 17.10.24 08:00	27.11.24 17:00		0
87.9	Ringbalken	10 28.11.24 08:00	11.12.24 17:00		0
88	**Fenster + Türen**	**15 12.12.24 08:00**	**01.01.25 17:00**		**0**
88.1	Montage Fenster + Außentüren	5 12.12.24 08:00	18.12.24 17:00		0
88.2	Montage Innentüren	10 19.12.24 08:00	01.01.25 17:00		0
89	**Schwimmbadt. Ausstattung**	**80 10.01.25 17:00**	**02.05.25 17:00**		**0**
89.1	Ausführungsplanung Schwimmbdt.	0 10.01.25 17:00	10.01.25 17:00		0
89.2	Werkplanung Breitrutsche und Sprunganlagen	38 13.01.25 08:00	05.03.25 17:00		0
89.3	Angabe Fundamente Breitrutsche und Sprunganla...	0 05.03.25 17:00	05.03.25 17:00		0
89.4	Werkseitige Herstellung	20 06.03.25 08:00	02.04.25 17:00		0
89.5	Montage Breitrutsche	22 03.04.25 08:00	02.05.25 17:00		0
89.6	Montage Sprunganlagen	10 03.04.25 08:00	16.04.25 17:00		0
89.7	Montage Duschen	10 03.04.25 08:00	16.04.25 17:00		0
90	**Zimmer- und Dachdeckerarbeiten**	**40 12.12.24 08:00**	**17.02.25 17:00**		**0**
90.2	Abbund Pultdach	10 12.12.24 08:00	25.12.24 17:00		0
90.3	Dachschalung+Dampfsperre	10 26.12.24 08:00	08.01.25 17:00		0
90.4	Dämmung Dach	10 09.01.25 08:00	22.01.25 17:00		0
90.5	Folienabdichtung (geklebt)	10 23.01.25 08:00	05.02.25 17:00		0
90.6	Dachrand+Entwässerung	8 06.02.25 08:00	17.02.25 17:00		0
100	**Fenster + Türen Technikgebäude**	**30 26.09.24 08:00**	**06.11.24 17:00**		**0**
100.1	Fenster + Türen Technikgebäude	30 26.09.24 08:00	06.11.24 17:00		0
100.2	Fenster und Türen T30 für Technikgebäude	10 26.09.24 08:00	09.10.24 17:00		0
102	**Badewassertechnik**	**245 19.04.24 08:00**	**27.03.25 17:00**		**0**
102.1	Abbruch alte Filter, Maschinen etc.	15 19.04.24 08:00	09.05.24 17:00		0
102.2	Installation Badewassertechnik	35 14.06.24 08:00	01.08.24 17:00		0
102.3	Rohleitungen BWT außen	14 27.01.25 08:00	13.02.25 17:00		0
102.4	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	15 14.02.25 08:00	06.03.25 17:00		0
102.5	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	7.5 07.03.25 08:00	18.03.25 12:00		0
102.6	Absanden + Verfüllen Rohrgräben	7.5 18.03.25 13:00	27.03.25 17:00		0
102.7	Elektro Badewassertechnik	15 14.02.25 08:00	06.03.25 17:00		0
106	Weihnachtspause	25 19.12.24 08:00	22.01.25 17:00		0
107	**Ausbau+Fassade Umkleidegebäude**	**87.38 20.12.24 08:00**	**22.04.25 11:00**		**0**
107.1	VHF	60 09.01.25 08:00	02.04.25 17:00		0
107.2	Grobinstallation HLSE	15 09.01.25 08:00	29.01.25 17:00		0
107.3	Zementputz	5 09.01.25 08:00	15.01.25 17:00		0
107.4	Trockenbauarbeiten	37.38 20.12.24 08:00	11.02.25 11:00		0
107.5	Estricharbeiten	5 11.02.25 11:00	18.02.25 11:00		0
107.6	Abdichtung + Fliesen	20 18.02.25 11:00	18.03.25 11:00		0
107.7	FeininstallationEndmontage HLSE	10 18.03.25 11:00	01.04.25 11:00		0
107.8	Ausbauarbeiten Umkleiden	10 01.04.25 11:00	15.04.25 11:00		0
107.9	PV-Anlage	15 05.03.25 08:00	25.03.25 17:00		0
107...	Blitzschutz	10 18.02.25 08:00	03.03.25 17:00		0
107...	Malerarbeiten	15 01.04.25 11:00	22.04.25 11:00		0
108	**Schlosserarbeiten**	**19 17.02.25 08:00**	**13.03.25 17:00**		**0**
108.1	Tore vor Einzelumkleidebereich	10 17.02.25 08:00	28.02.25 17:00		0
108.2	Geländer+Absturzsicherungen	10 28.02.25 08:00	13.03.25 17:00		0
108.3	Stahltreppe Technikraum KIB	10 17.02.25 08:00	28.02.25 17:00		0
124	**Außenanlagen**	**291.63 16.05.24 11:00**	**27.06.25 17:00**		**0**
124.1	Pflasterarbeiten Beckenumgänge ABS	40 05.05.25 08:00	27.06.25 17:00		0
124.2	Pflasterarbeiten Wege FS+	40 18.11.24 08:00	10.01.25 17:00		0
124.3	Anlagen der Pflanzstreifen u. Pflanzarbeiten ???	20 16.05.24 11:00	13.06.24 11:00		0
124.4	Rasensaat Liegeflächen ???	15 20.05.24 08:00	07.06.24 17:00		0
125	Beizreinigung und Inst. Attraktionen	10 27.01.25 08:00	07.02.25 17:00		0
126	Befüllung der Becken	10 07.03.25 08:00	20.03.25 17:00		0
127	**Förmliche Abnahmen**	**145.75 28.11.24 08:00**	**19.06.25 15:00**		**0**
127.1	Probelauf + Färbeversuch	10 21.03.25 08:00	03.04.25 17:00		0
127.2	Förmliche Abnahmen	14.25 28.11.24 08:00	18.12.24 10:00		0
127.3	Förmliche Abnahmen	11.38 05.05.25 08:00	20.05.25 11:00		0
127.4	Förmliche Abnahmen	9.13 20.05.25 11:00	02.06.25 12:00		0
127.5	Förmliche Abnahmen	7.38 02.06.25 13:00	11.06.25 16:00		0
127.6	Förmliche Abnahmen	5.88 11.06.25 16:00	19.06.25 15:00		0
127.8	TÜV-Prüfungen	10 04.04.25 08:00	17.04.25 17:00		0
127.9	Abnahme Gesundheitsamt	10 04.04.25 08:00	17.04.25 17:00		0
128	Reinigungsarbeiten	30 21.03.25 08:00	01.05.25 17:00		0
129	Eröffnung	0 15.05.25 11:00	15.05.25 11:00		0
130	Verwendungsnachweis	120 15.05.25 11:00	30.10.25 11:00		0
131	..	1 10.07.23 08:00	10.07.23 17:00		0
132	..	1 10.07.23 08:00	10.07.23 17:00		0
