Projektnummer: FS321

Bauzeitenplan

Neubau Kita Florstadt - Terminplan_Planung

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	Kick off Termin	5at	Mo, 28.09.20	Fr, 02.10.20	AG
2	LPH 1-2 Gebäudeplanung/Freianlagen	55at	Mo, 05.10.20	Fr, 18.12.20	EBB
3	LPH 1-2 TGA/Tragwerksplanung	40at	Mo, 26.10.20	Fr, 18.12.20	TGA/Statik
4	Bodengutachten/Vermesser/Entwurf Brandschutz	30at	Mo, 19.10.20	Fr, 27.11.20	AG/EBB
5	Jahreswechsel	13at	Mo, 21.12.20	Fr, 08.01.21	Projektteam
6	LPH 3-4 Gebäudeplanung/Freianlagen	15at	Mo, 04.01.21	Fr, 22.01.21	EBB
7	Lüftungs-/Entwässerungsgesuch TGA	15at	Mo, 04.01.21	Fr, 22.01.21	IRE/IGMBH
8	Friegabe durch AG	5at	Mo, 25.01.21	Fr, 29.01.21	
9	Genehmigungsverfahren/Baugenehmigung	58at	Mo, 01.02.21	Fr, 23.04.21	Projektteam/Behörden
10	LPH 5 Gebäudeplanung erweiterter Rohbau	48at	Mo, 01.02.21	Fr, 09.04.21	EBB
11	Ausführungsplanung TGA/Statik	38at	Mo, 15.02.21	Fr, 09.04.21	TGA/Statik
12	Übergabe und Freigabe an/durch AG	5at	Mo, 12.04.21	Fr, 16.04.21	AG
13	LPH 6 Gebäude erweiterter Rohbau	20at	Mo, 01.03.21	Fr, 26.03.21	EBB
14	Übergabe und Freigabe an/durch AG	5at	Mo, 29.03.21	Di, 06.04.21	
15	Vergabeverfahren für Rohbau	20at	Mi, 07.04.21	Di, 04.05.21	AG
16	Angebotsprüfung LPH 7/Vergaben Pkt. 11	5at	Mi, 05.05.21	Di, 11.05.21	EBB/AG
17	LPH 6 TGA	10at	Mo, 12.04.21	Fr, 23.04.21	IRE
18	Vergabeverfahren für TGA	20at	Mo, 26.04.21	Di, 25.05.21	AG
19	Angebotsprüfung LPH 7/Vergaben TGA	5at	Mi, 26.05.21	Di, 01.06.21	IRE/AG
20	LPH 5 Gebäudeplanung Innenausbau/Freianlagen	19at	Mo, 19.04.21	Fr, 14.05.21	EBB
21	LPH 6 Gebäude Innenausbau/Freianlagen	22at	Mo, 03.05.21	Fr, 04.06.21	EBB
22	Übergabe und Freigabe an/durch AG	5at	Mo, 07.06.21	Fr, 11.06.21	
23	Vergabeverfahren für Innenausbau/Freianlagen	20at	Mo, 14.06.21	Fr, 09.07.21	AG
24	Angebotsprüfung LPH 7/Vergaben Pkt. 18	5at	Mo, 12.07.21	Fr, 16.07.21	EBB/AG
25	Einweisung/Anbesteckung usw.	5at	Di, 25.05.21	Mo, 31.05.21	Projektteam/Firmen
26	Bauzeit bis zur Übergabe (nach ges. Bauzeitenplan)	265at	Di, 25.05.21	Fr, 03.06.22	Projektteam/Firmen
27	Ausstattung, Inbetriebnahme, Übergabe	18at	Di, 07.06.22	Fr, 01.07.22	AG

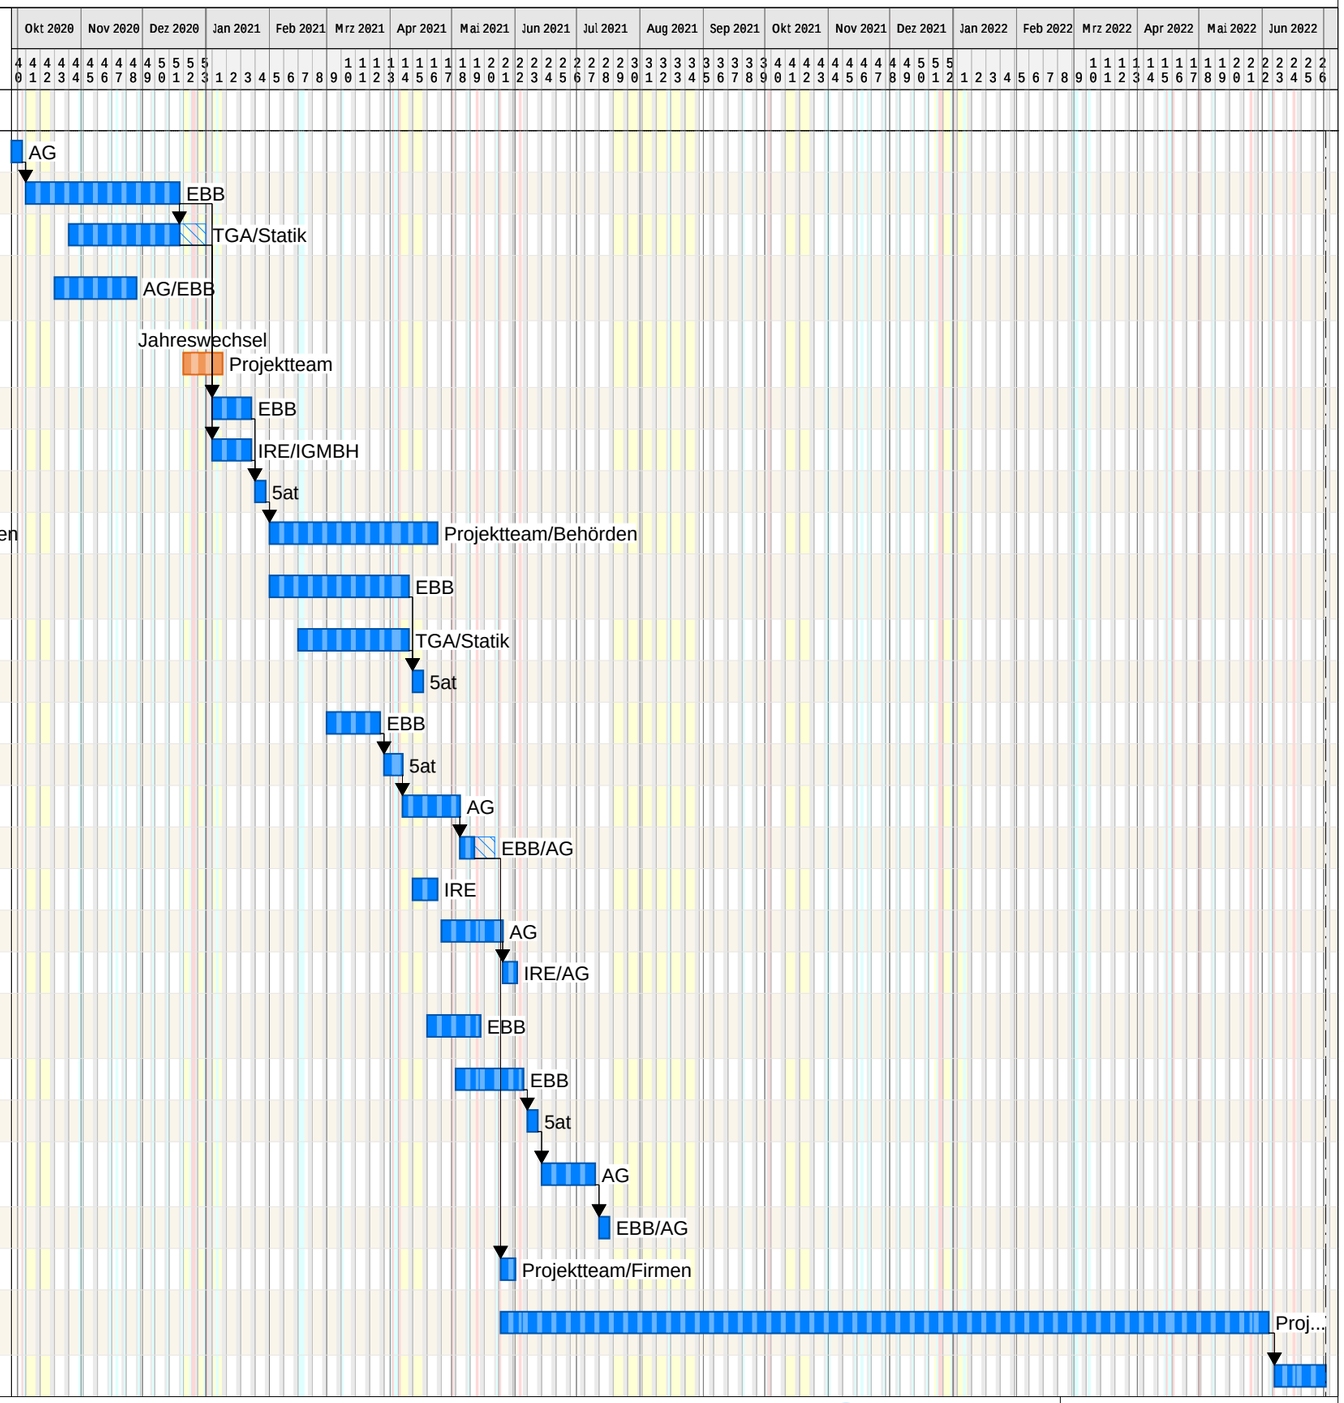

Projektzeitrahmen von Mo, 28.09.20 bis Fr, 16.12.22
Kalender: Hessen
Druckdatum: 21.12.2020 08:40
Filter:
Bearbeiter: Armin

igmbh
Otto-Hahn-Str. 3
D-61137 Schöneck
Tel. +49 6187 95 600
Fax +49 6187 95 60 60
e-Mail: armin.uhrig@igmbh.de

erstellt mit pro-Plan 7 (7.0.0.25) Serien Nr.: 712 Lizenz für Müller mbH, Schöneck
